

VBK
Bewegt alle.

Anwohner/-innen und Gewerbetreibende Informationsveranstaltung

Barrierefreier Ausbau und Verlängerung der TBB

Karlsruhe | 20. Oktober 2026 | PA - Projektabwicklung

Bisheriger Projektverlauf

Oktober 2025	Erteilung Planfeststellungbeschluss durch das RP Karlsruhe
Dezember 2025	Zustellung positiver Förderbescheid
Januar 2026	Beginn Ausführungsplanung Garaventa
Februar 2026	Vorbereitende Maßnahmen für Abbrucharbeiten


Bisheriger Projektverlauf

März – Oktober 2026 Rückbau- und Abbrucharbeiten







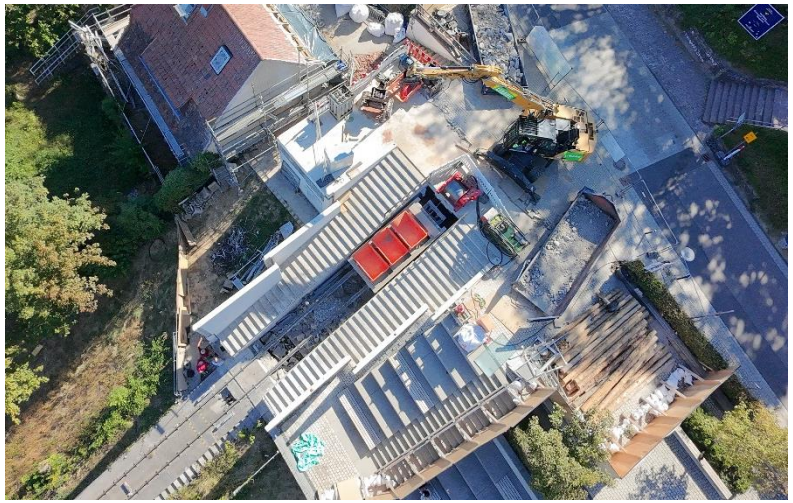



Bisheriger Projektverlauf

Juni- Oktober 2026 Leitungsverlegungsarbeiten B3-Bergbahnstr.








Leitungsverlegungsarbeiten

November 26 -April 27

Übersicht

- Leitungsverlegungsarbeiten aufgrund des Neubaus der Turmbergbahn sowie des Unterführungsbauwerks
- Umsetzung in kleinteiligen Bauabschnitten, um Verkehrsfluss, Versorgungssicherheit sowie die Funktion der Druckzonen aufrechtzuerhalten
  - Sollten kurzfristige Versorgungsunterbrechungen erforderlich werden, informieren die Stadtwerke Karlsruhe die Betroffenen mindestens 48 Stunden im Voraus
- Kanalumbau
- Einbringen eines Druckmindererschachts in der Turmbergstr./ Bereich alte Talstation
- Verlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen
- Verlegung von Telekommunikationsleitungen


Übersicht Baufelder Leitungsverlegungsarbeiten

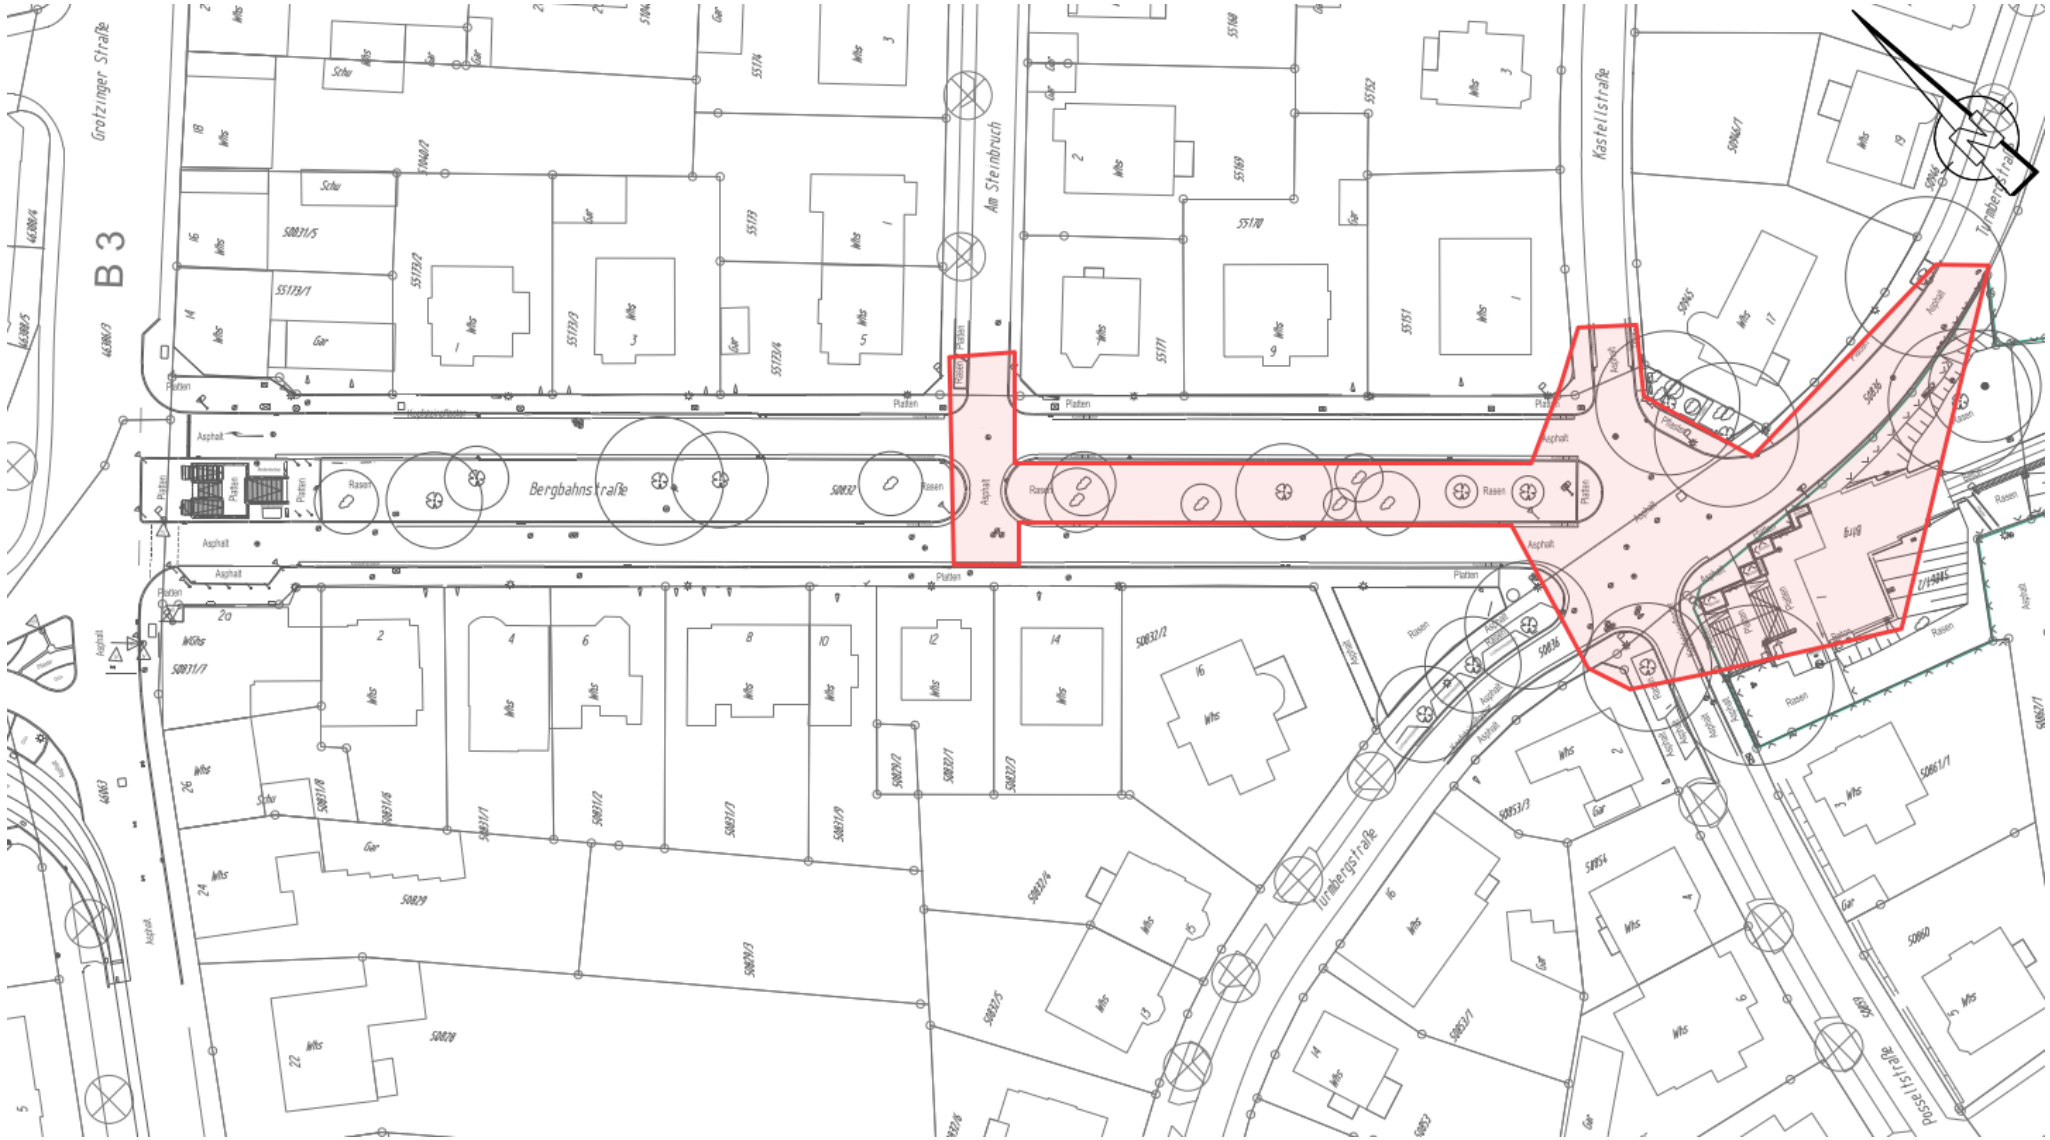

Barrierefreier Ausbau und Verlängerung der Turmbergbahn

Übersicht Bauphasen Leitungsverlegungsarbeiten


November 26 - April 27

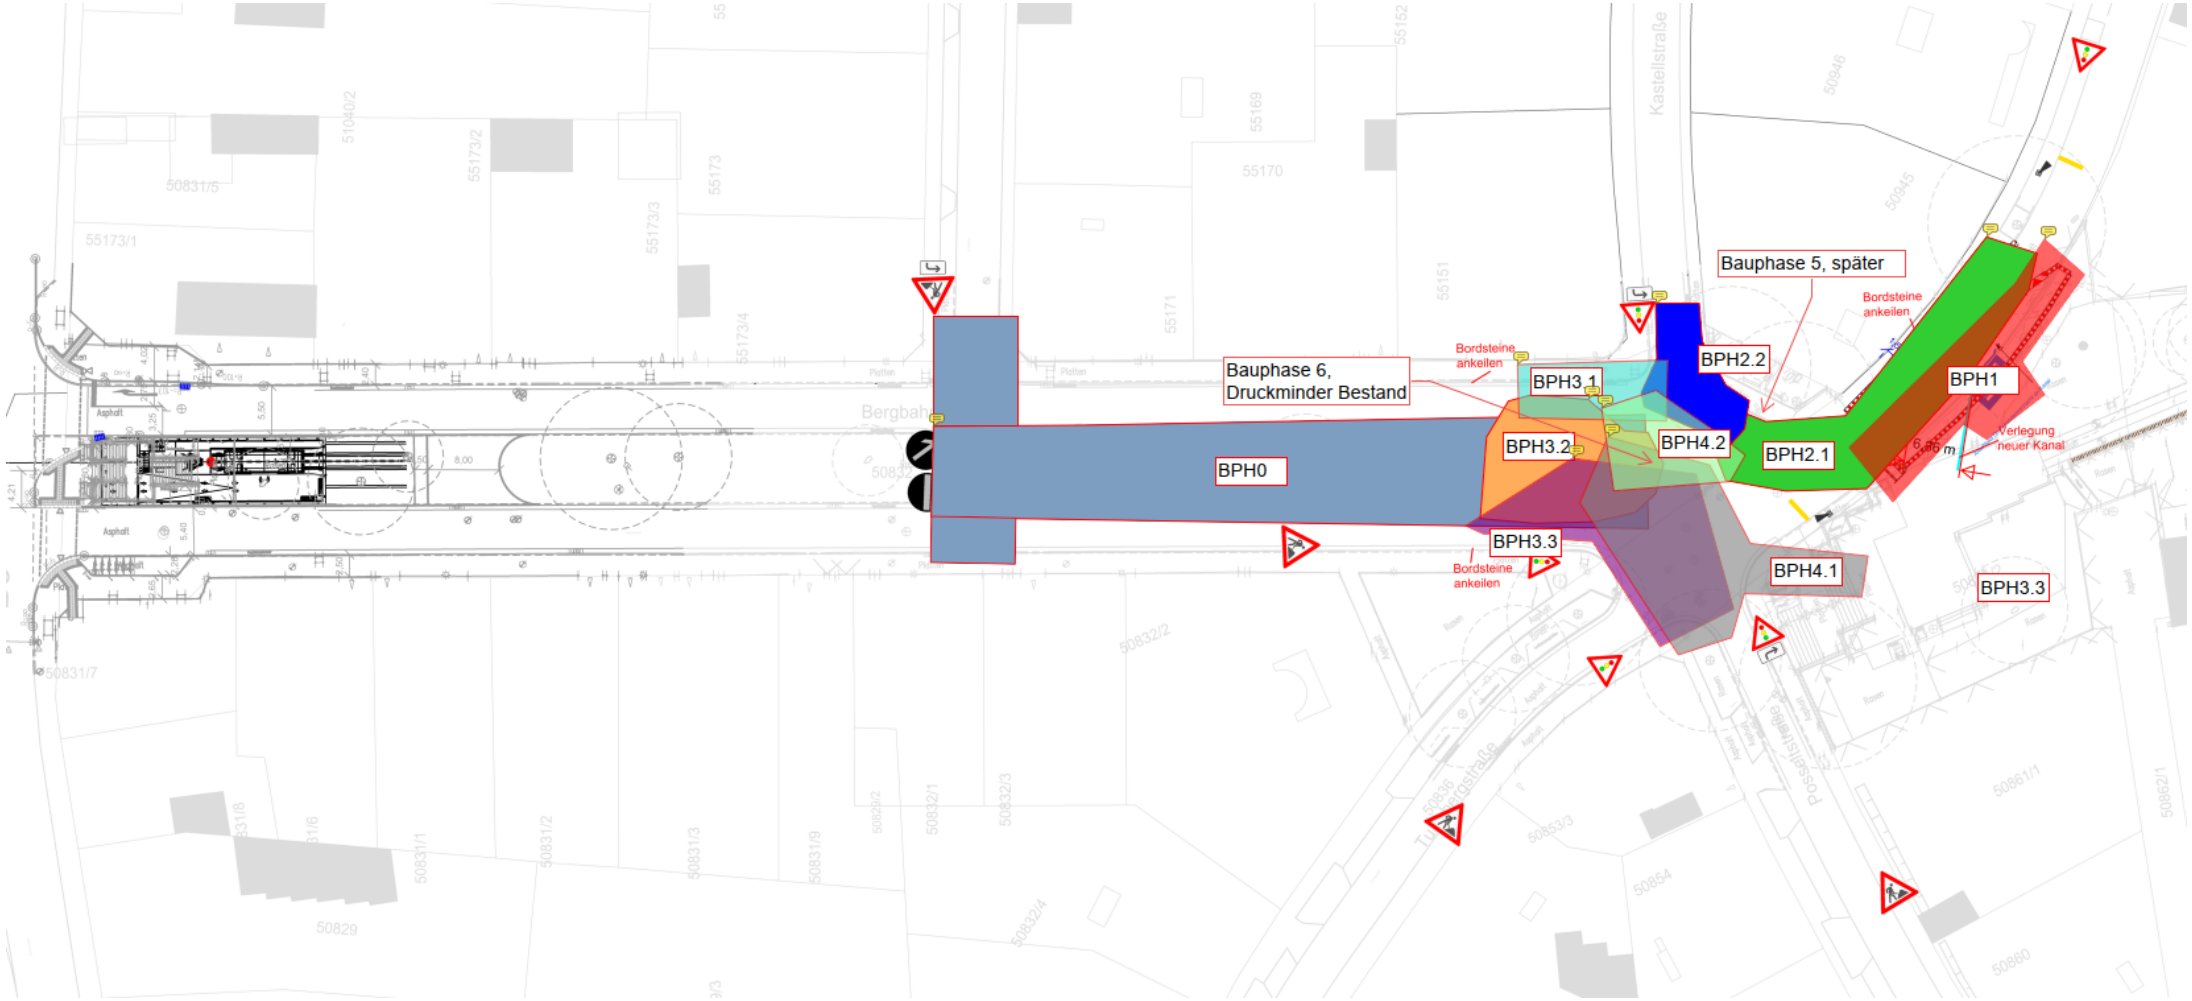

Verkehrslenkung Leitungsverlegungsarbeiten

November 26


Verkehrsführung während Bauphase 1

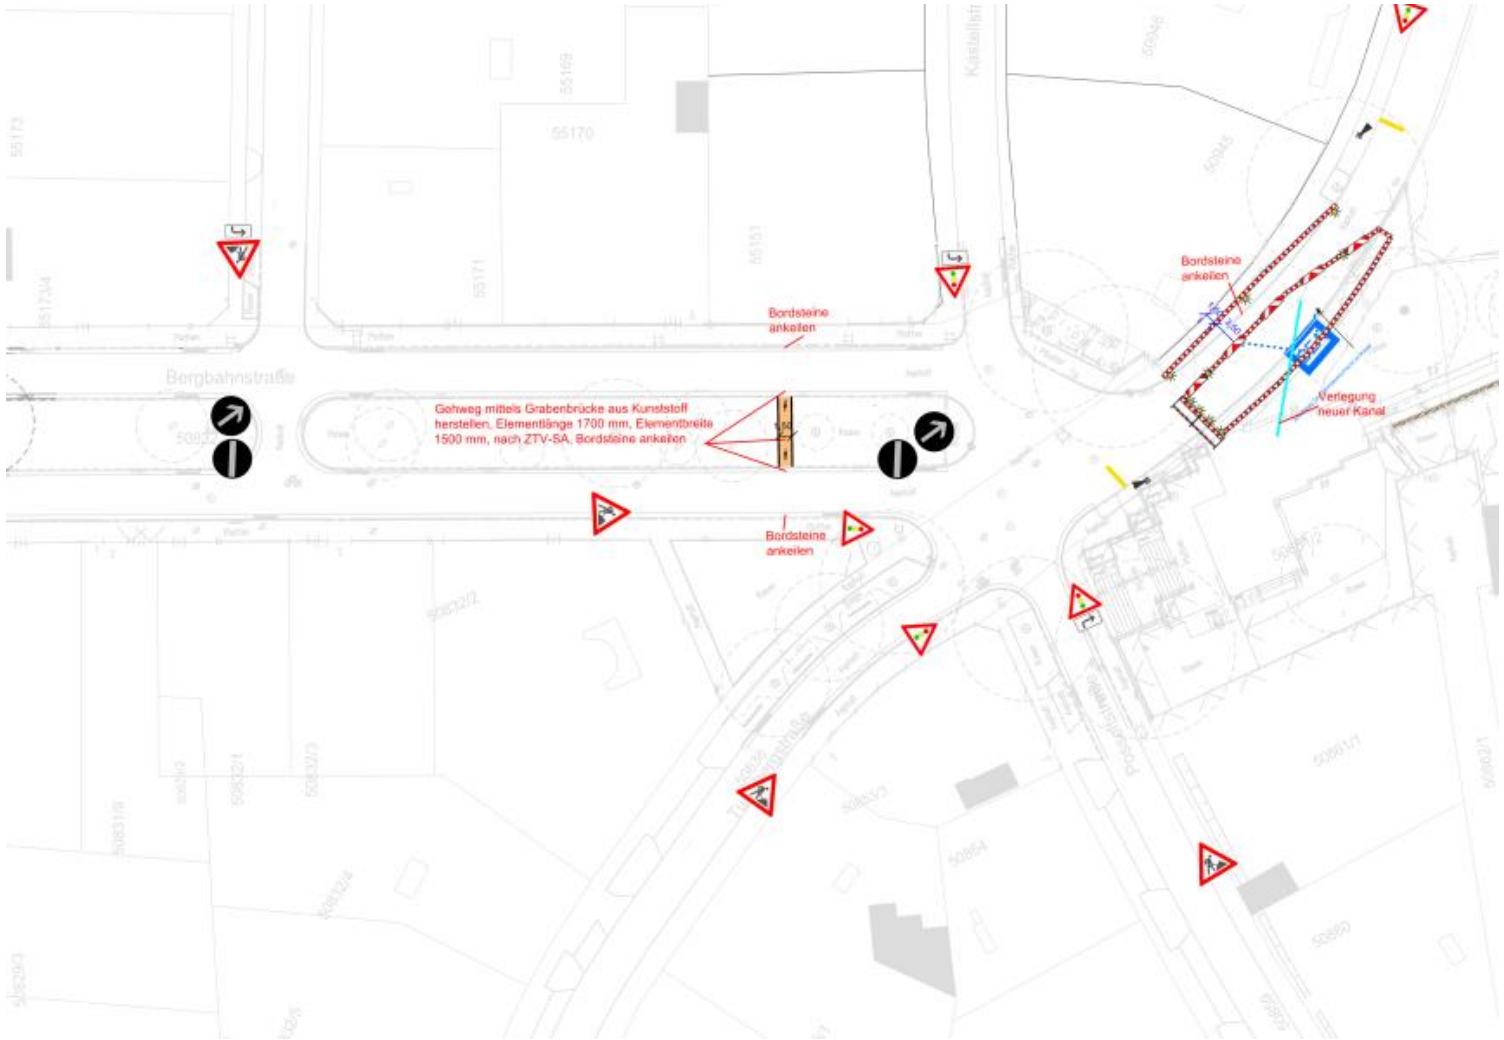

Verkehrslenkung Leitungsverlegungsarbeiten


Nov. – Dez. 26

Verkehrsführung während Bauphase 2.1

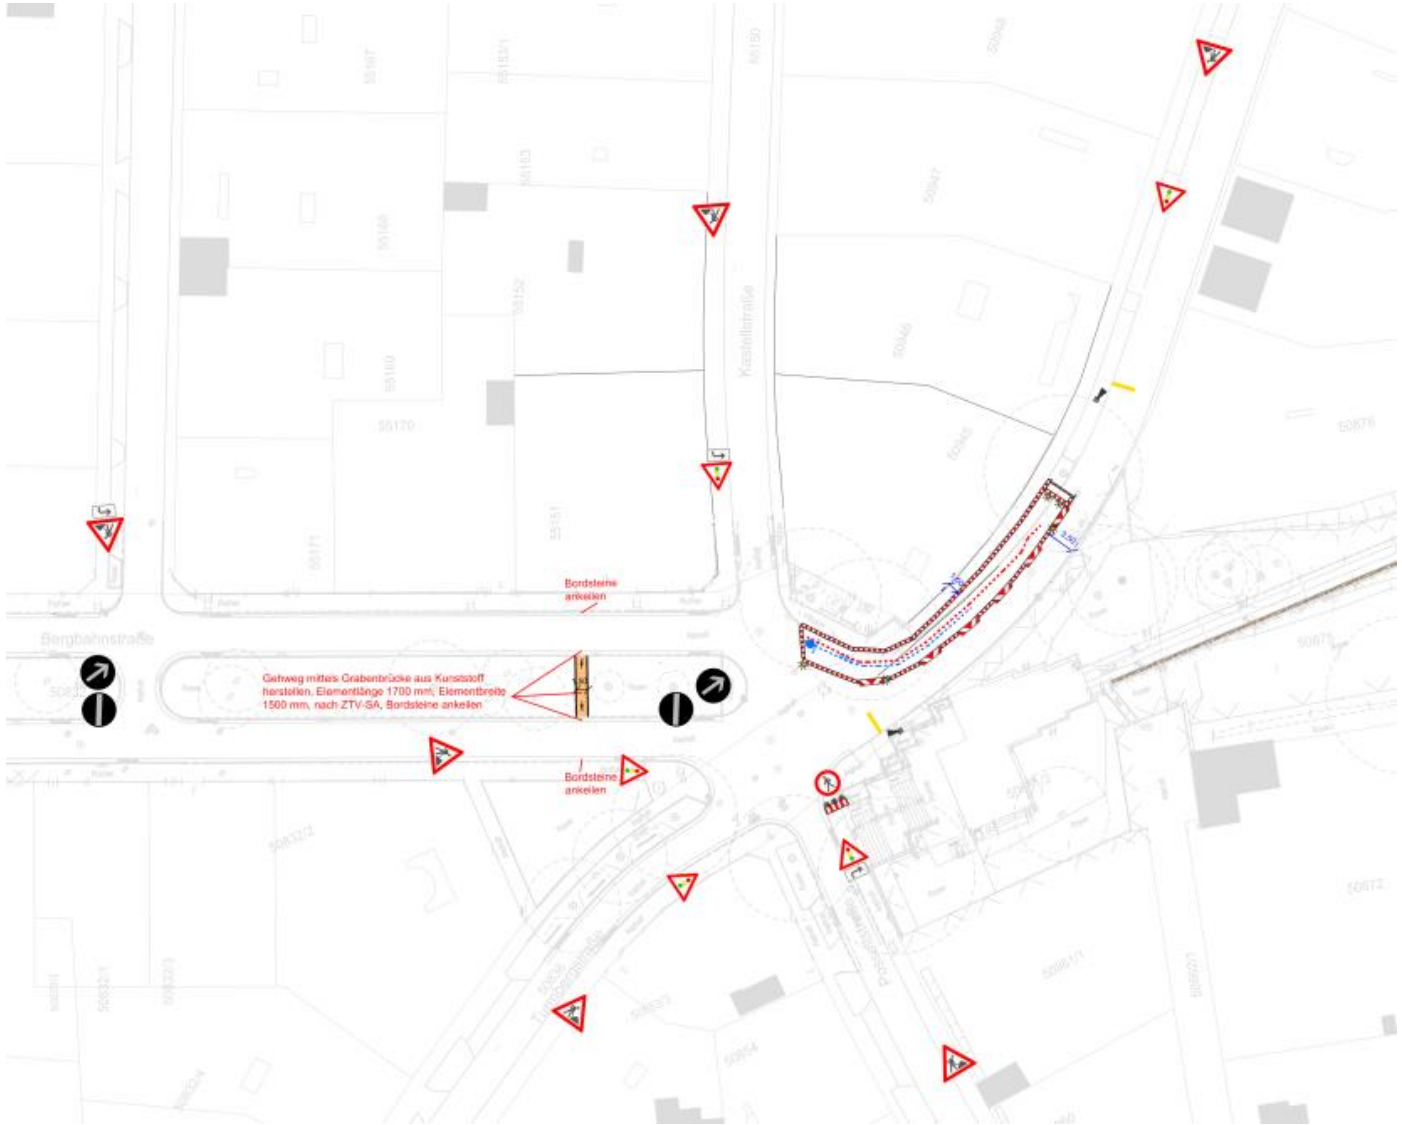

Verkehrslenkung Leitungsverlegungsarbeiten

Verkehrsführung während Bauphase 2.2

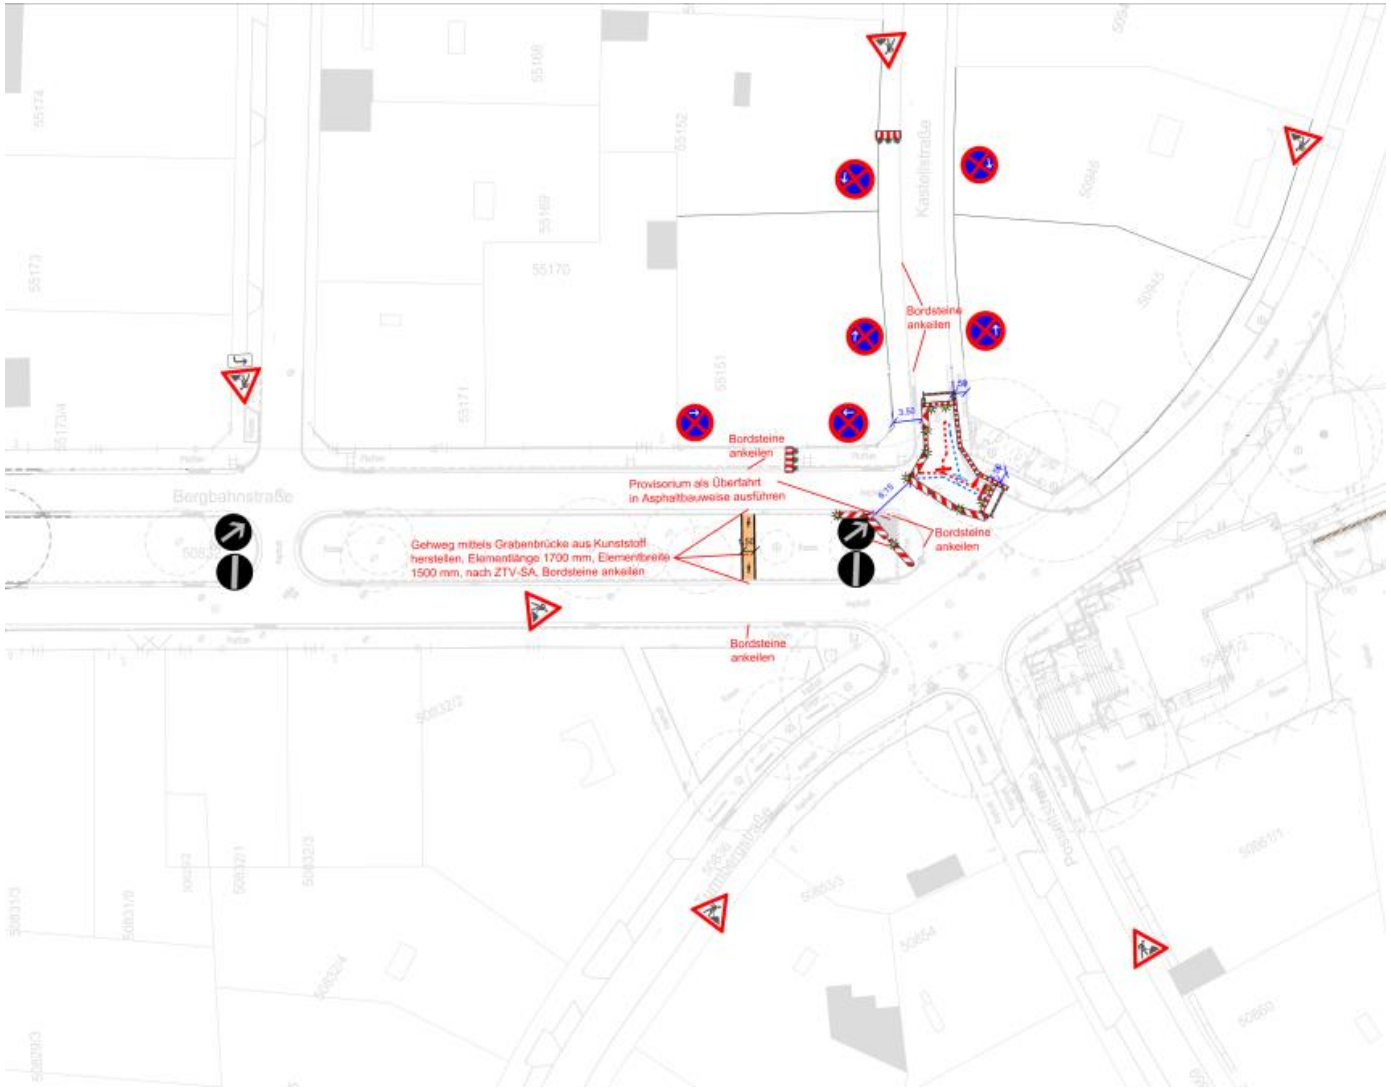

Leitungsverlegungsarbeiten

Verkehrslenkung während Baumaßnahmen

- Die Erreichbarkeit der angrenzenden Straßen wird während der Bauzeit grundsätzlich sichergestellt
- Baulich bedingte kleinteilige Einschränkungen im Kreuzungsbereich der alten Talstation
- Die Ausfahrt aus der Bergbahnstraße bleibt bis Ende des Jahres grundsätzlich offen
- Ab Januar 2027 werden für die Neubauarbeiten entsprechende Umleitungen und alternative Fahrtrouten ausgeschildert
- Verkehrsführungen sind mit der Branddirektion und dem Team Sauberes Karlsruhe abgestimmt

Leitungsverlegungsarbeiten

Lärm- und Erschütterung

- Baubegleitende Lärm und Erschütterungsmessungen werden bei lärm- und erschütterungsintensiven Arbeiten durch Immissionsschutzbeauftragten durchgeführt
- Auflage zur Nutzung erschütterungsarmer Bauverfahren und Maschinen
- Keine lärm- und erschütterungsintensiven Verbau- Verfahren für den Leitungsbau geplant
- Festlegung der täglichen Arbeitszeit von 7:00 bis 18:00 Uhr, wobei Arbeiten mit hoher Schallemission nur von 8:00 bis 17:00 Uhr mit einer Pause von 12:00 bis 14:00 Uhr durchgeführt werden dürfen

Wie geht es dann weiter?

- Neubauarbeiten Garaventa November 2026 – Oktober 2027
- Weitere Informationsveranstaltung in Q2/2027
- Herstellung Verkehrswege Q4/2027
- Inbetriebnahme November 2027 bis März 2028

Ihr Kontakt zu den VBK

Eine weitere Informationsveranstaltung ist vsl. in Q2/2027 geplant

E-Mail: baustellenservice@vbk.karlsruhe.de

Service-Nummer: 0721 6107-5885



Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit

Garaventa


Barrierefreier Ausbau und Verlängerung der Turmbergbahn

Anwohnerinformation


20. Oktober 2026




Streckenverlauf und Baufelder

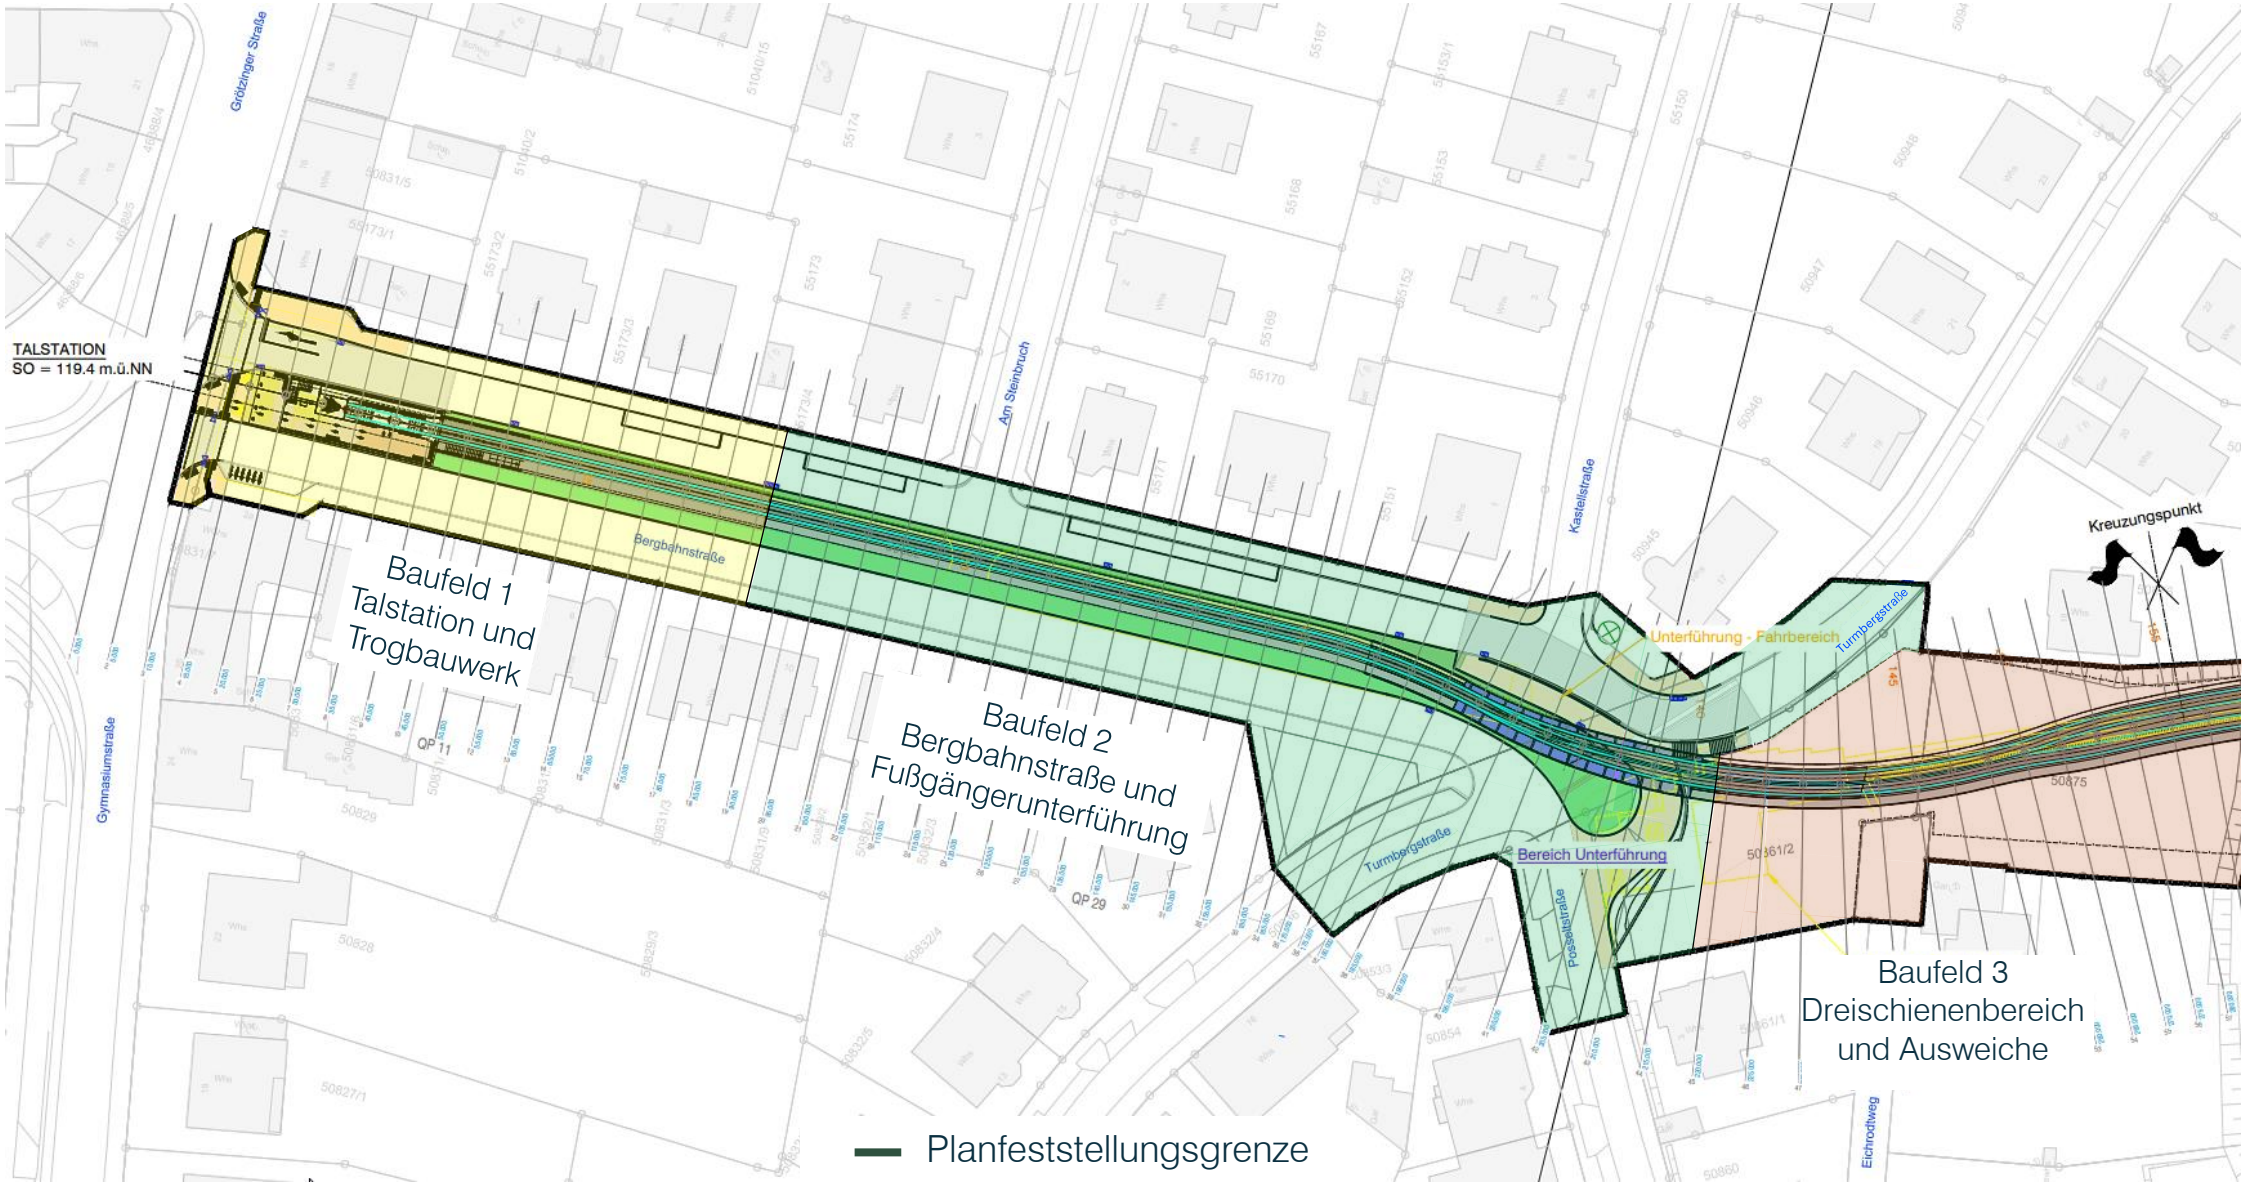

Streckenverlauf und Baufelder

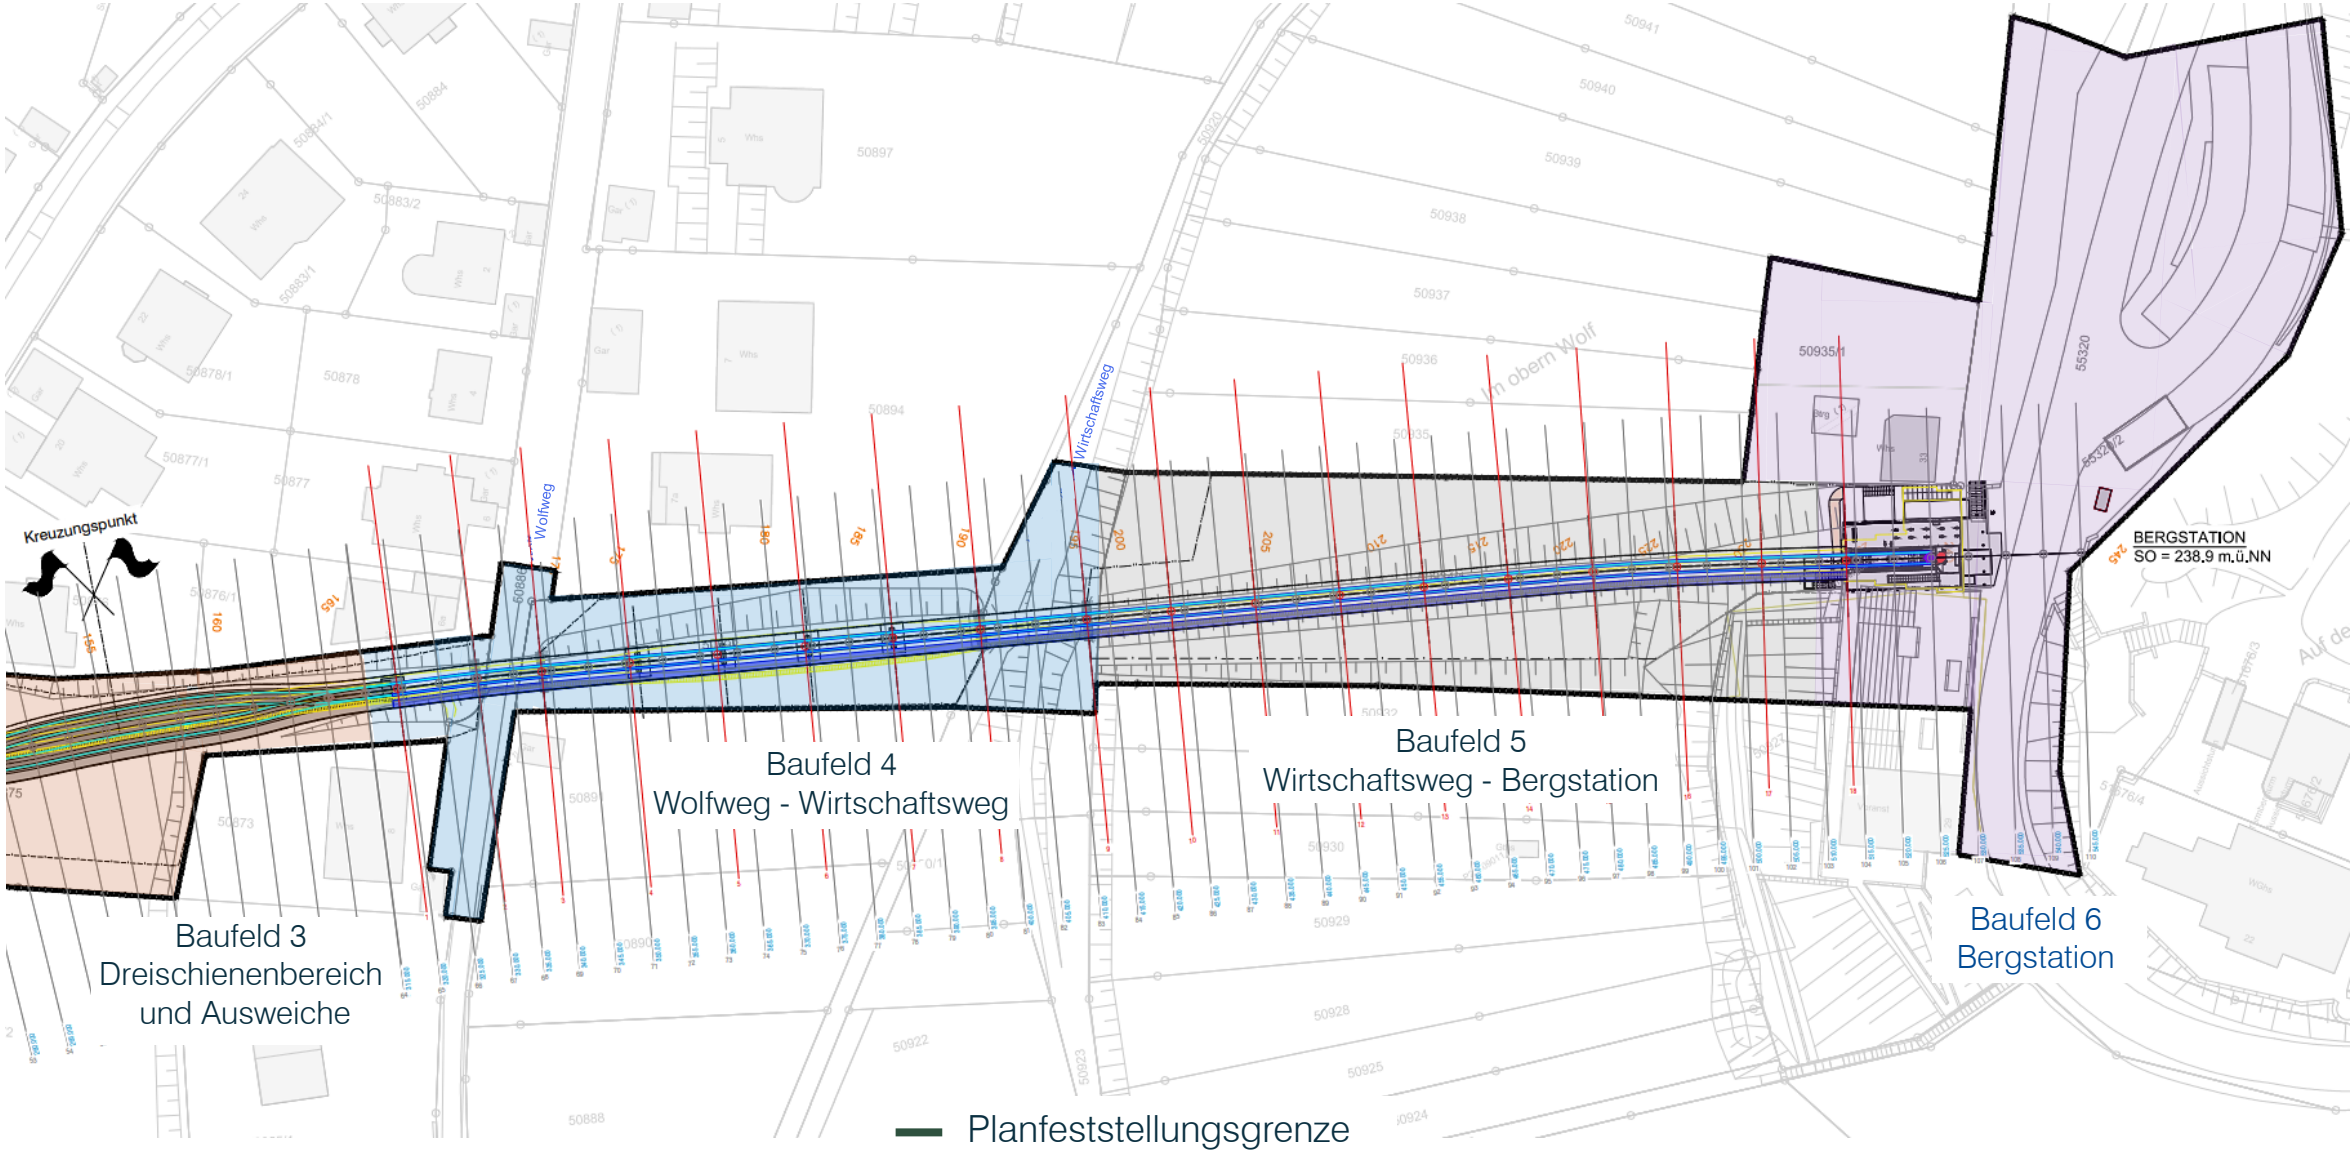

Projektablauf

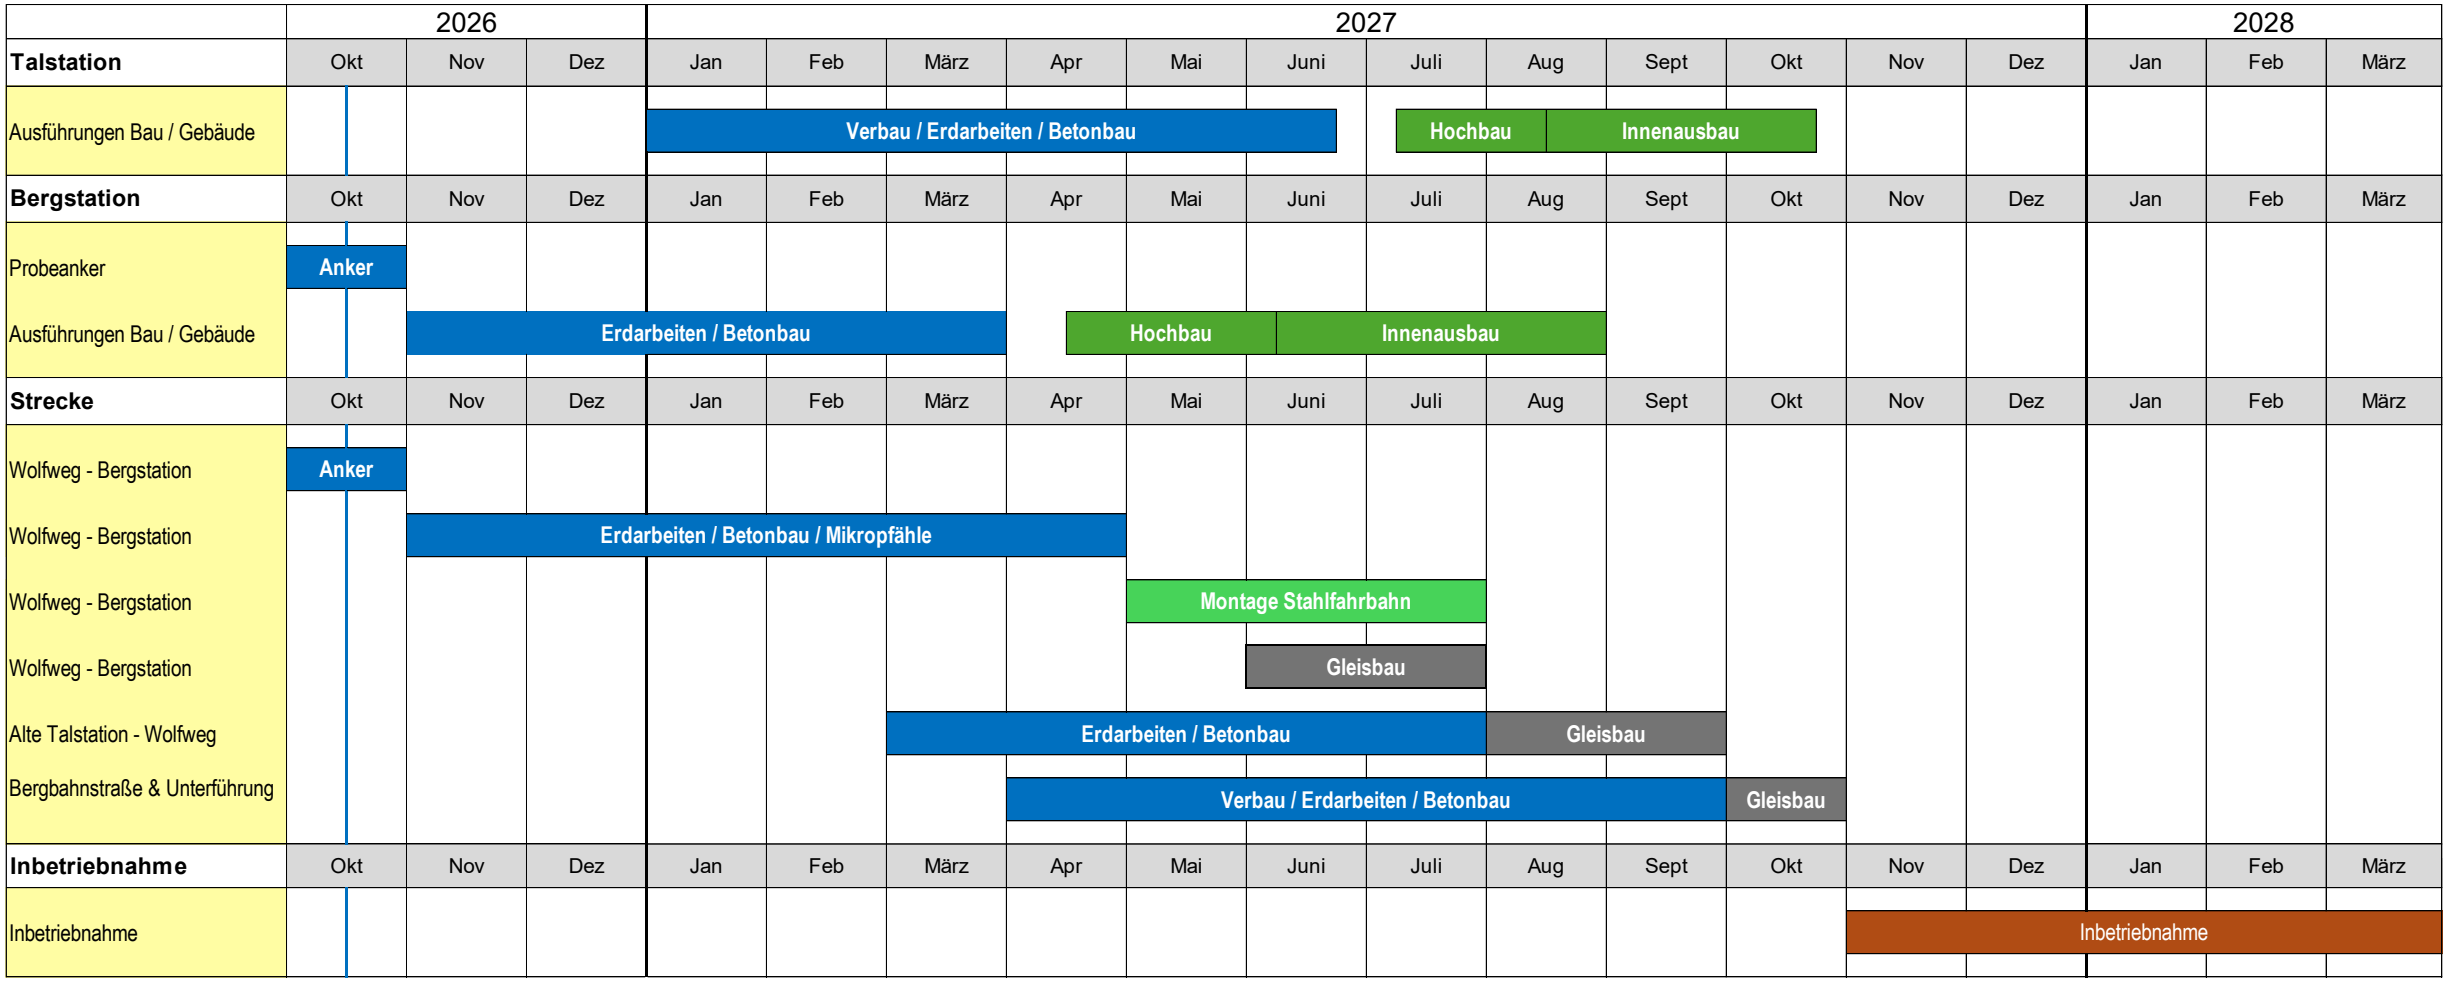


Baufeld 1: Talstation und Trogbauwerk

Januar 2027 – Oktober 2027



Baustelleneinrichtung Talstation und Trogbauwerk

Januar 2027 – Oktober 2027

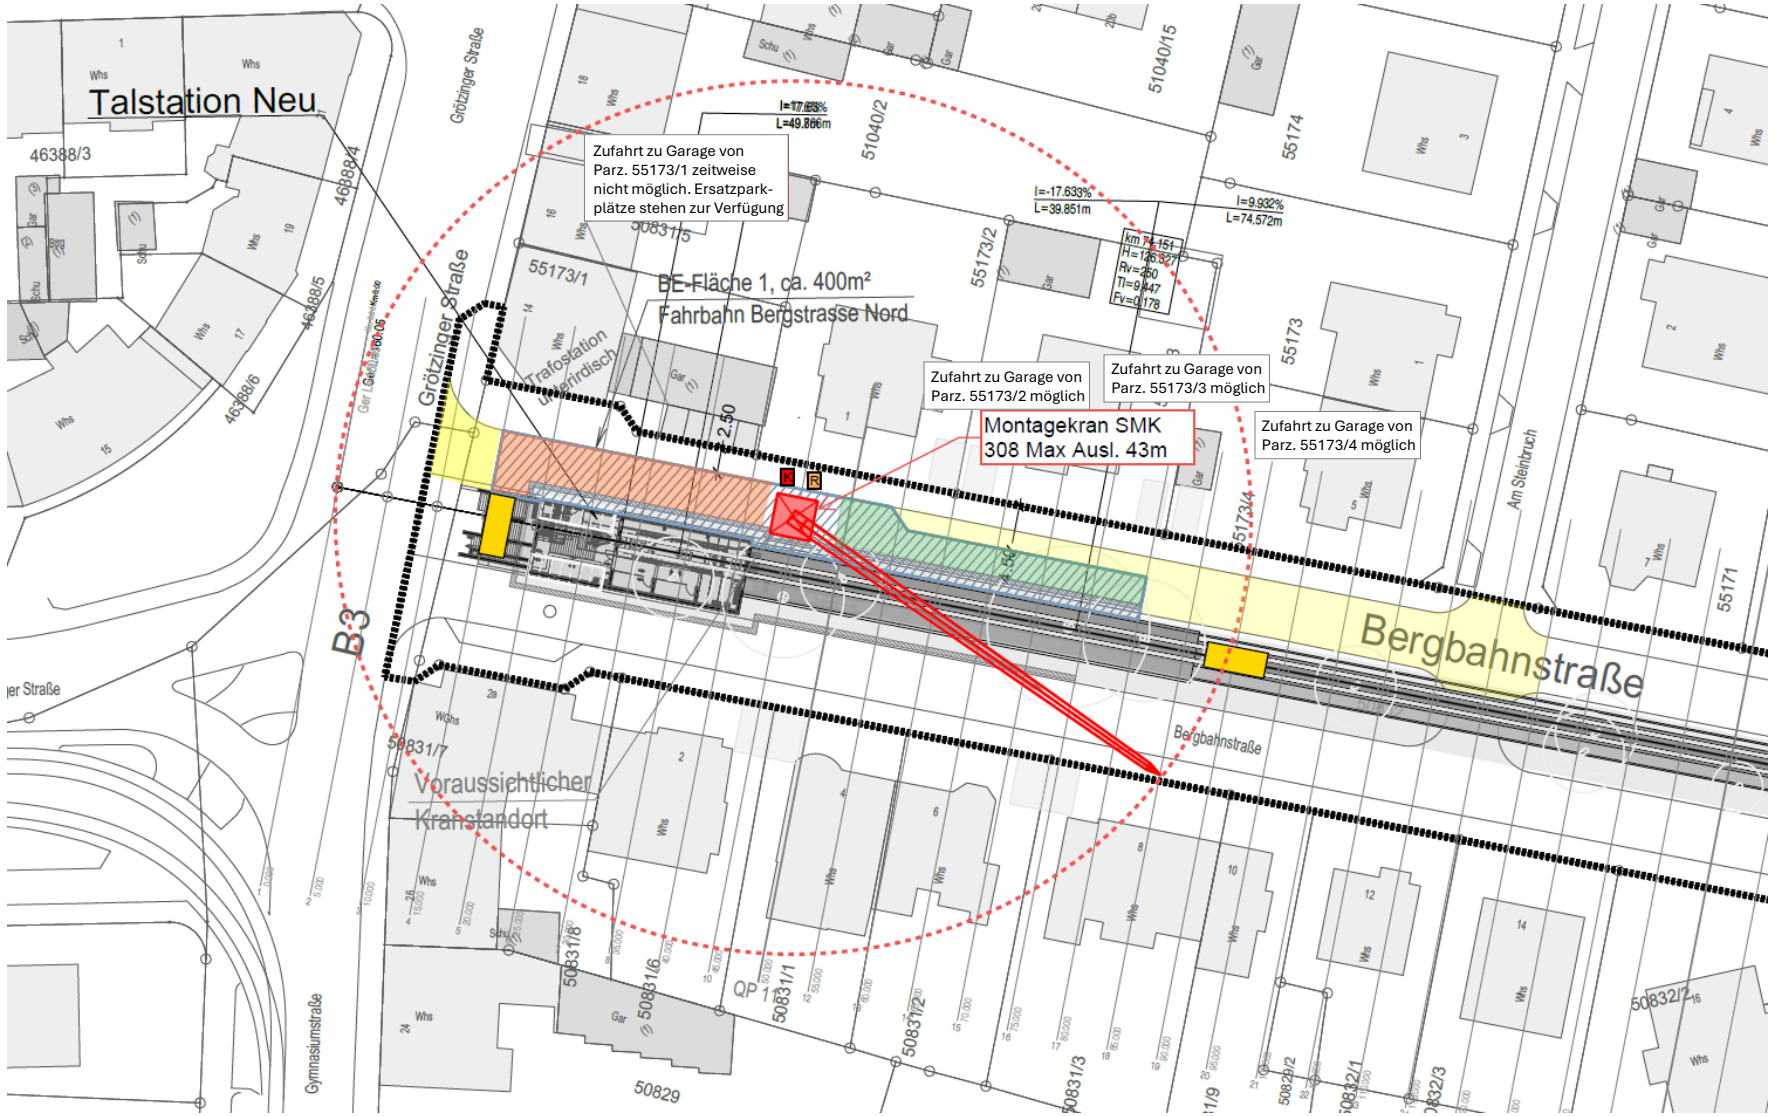

- Zufahrt/Ausfahrt eingeschränkt
- Schutzzaun
- Zufahrtsrichtungen
- Be- und Entladefläche
- Zufahrtswege
- Materiallagerfläche
- Ursprüngliche BE-Fläche


- Schaltschrank ENBW
- Stromverteiler Reif
- Unterflurhydrant

Legende

- BE-Flächen
- Planfeststellungsgrenze
- Aushubbereich Berg
- Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.12.012
- Wasserschutzgebiet Nr. 212.010, Zone IIIB
- Baubereich
- Baugrubensicherung
- Einfahrten Privatparzellen
- Baupiste
- Best. Bäume schützen
- Rodung Bäume, Sträucher, Gehölze
- Blaueinträge

Arbeiten für Verbau Talstation und Trogbauwerk

Januar 2027 – Februar 2027

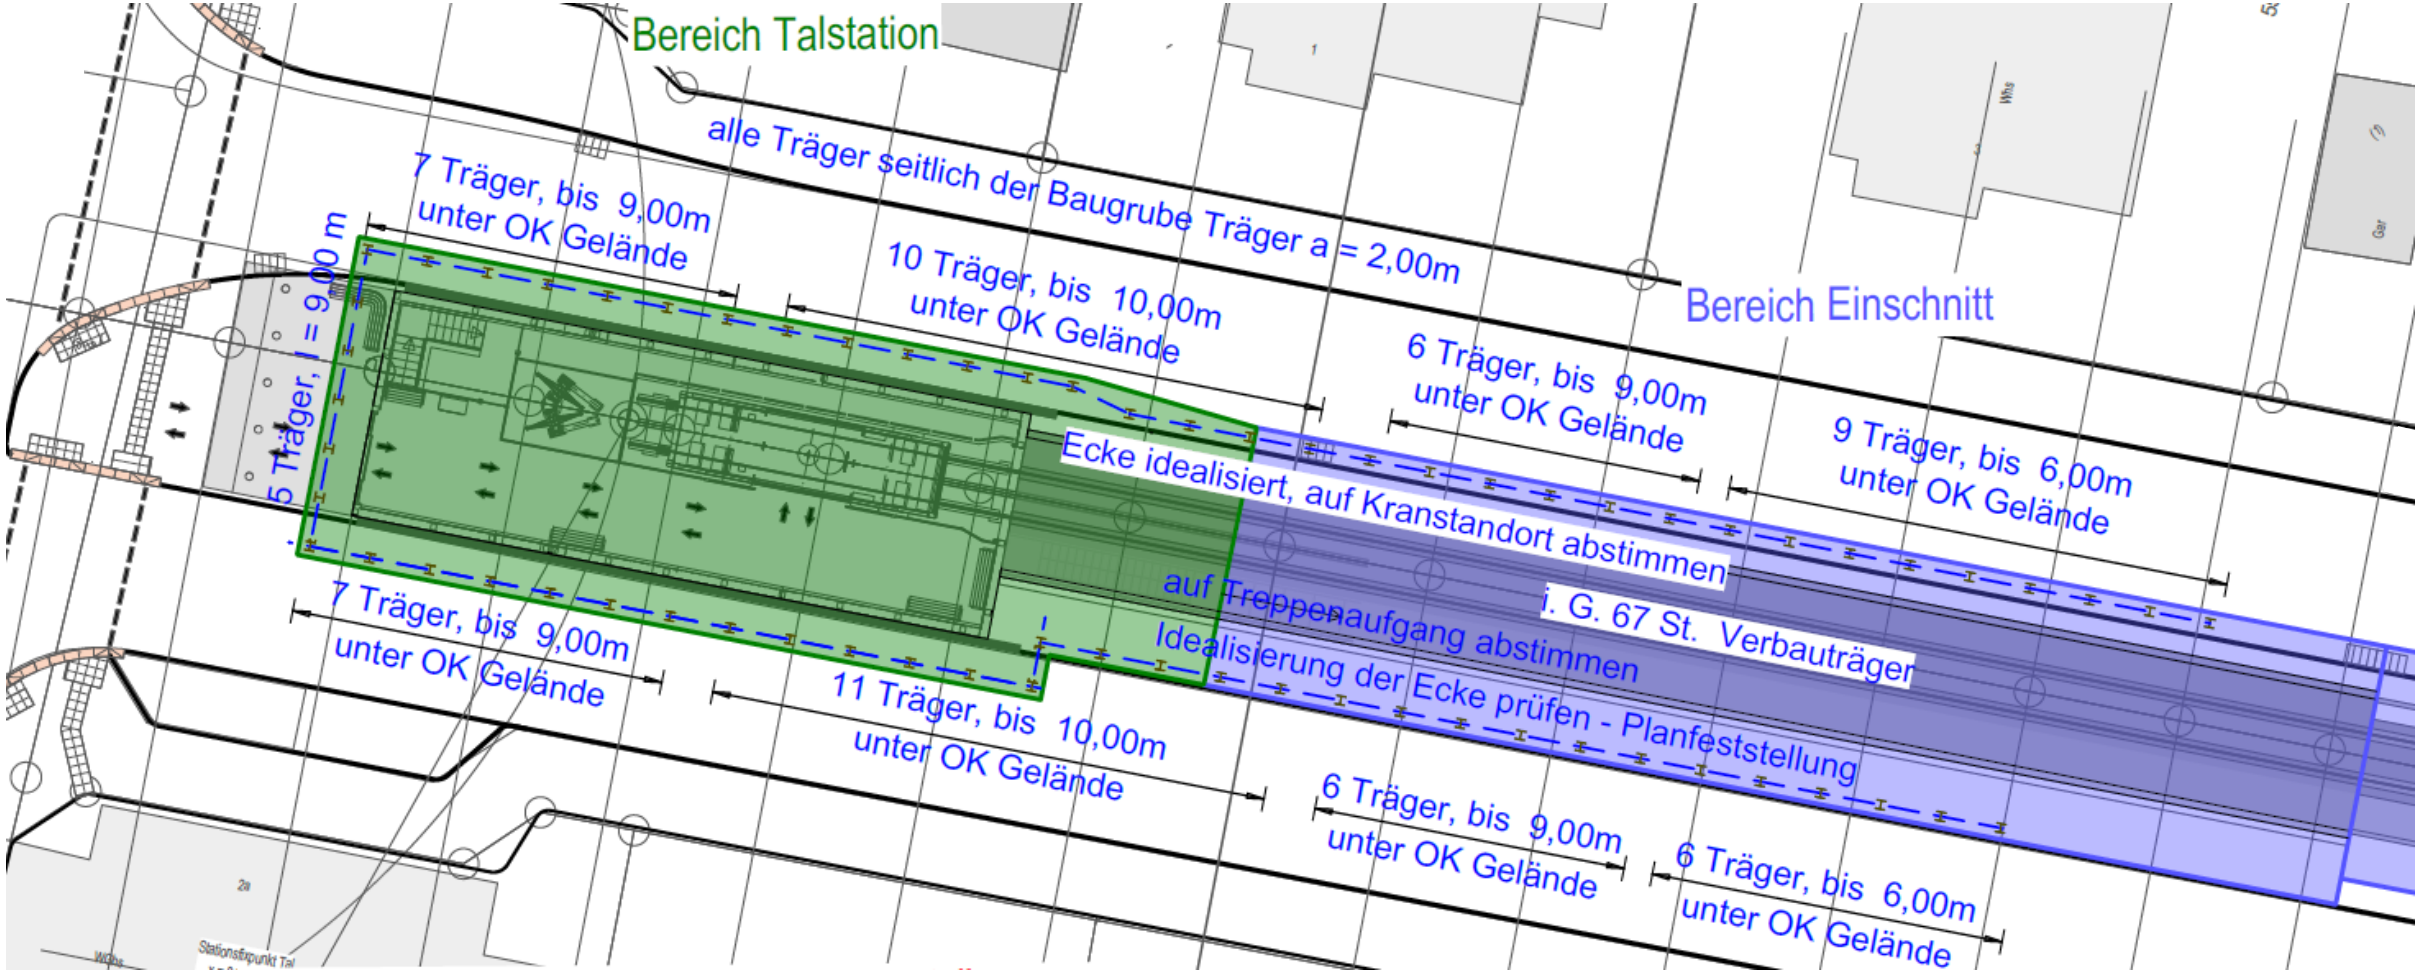

Baugeräte für Verbau Talstation und Trogbauwerk

Januar 2027 – Februar 2027

Herstellung Verbau und Baugrubenaushub

- Verbau: Herstellung Bohrungen für Verbauträger mit Drehbohrgerät ca. 50to
- Aushub: Mit verschiedenen Kettenbaggern von ca. 8to bis 24to
- Abfuhr Aushub: LKW 4-Achser ca. 32to
- Kleingeräte: Radlader ca. 5to
- Verdichtung Untergrund: Rüttelplatten und Stampfer bis 1to



Auszug aus dem Fuhrpark der Firma Reif



Beispiel eines Bohrgerätes

Baugeräte für Talstation


Januar 2027 – Oktober 2027

Betonbau Talstation

- Schnellmontagekran mit Ausladung 43m
- Radlader mit ca. 5to
- LKW-Fahrmischer 5-Achser ca. 32to
- Kleingeräte: Radlader ca. 5to
- Verdichtung Untergrund: Rüttelplatten und Stampfer bis 1to

Hochbau Talstation


- Mobilkran ca. 60to
- Hebebühnen
- LKW

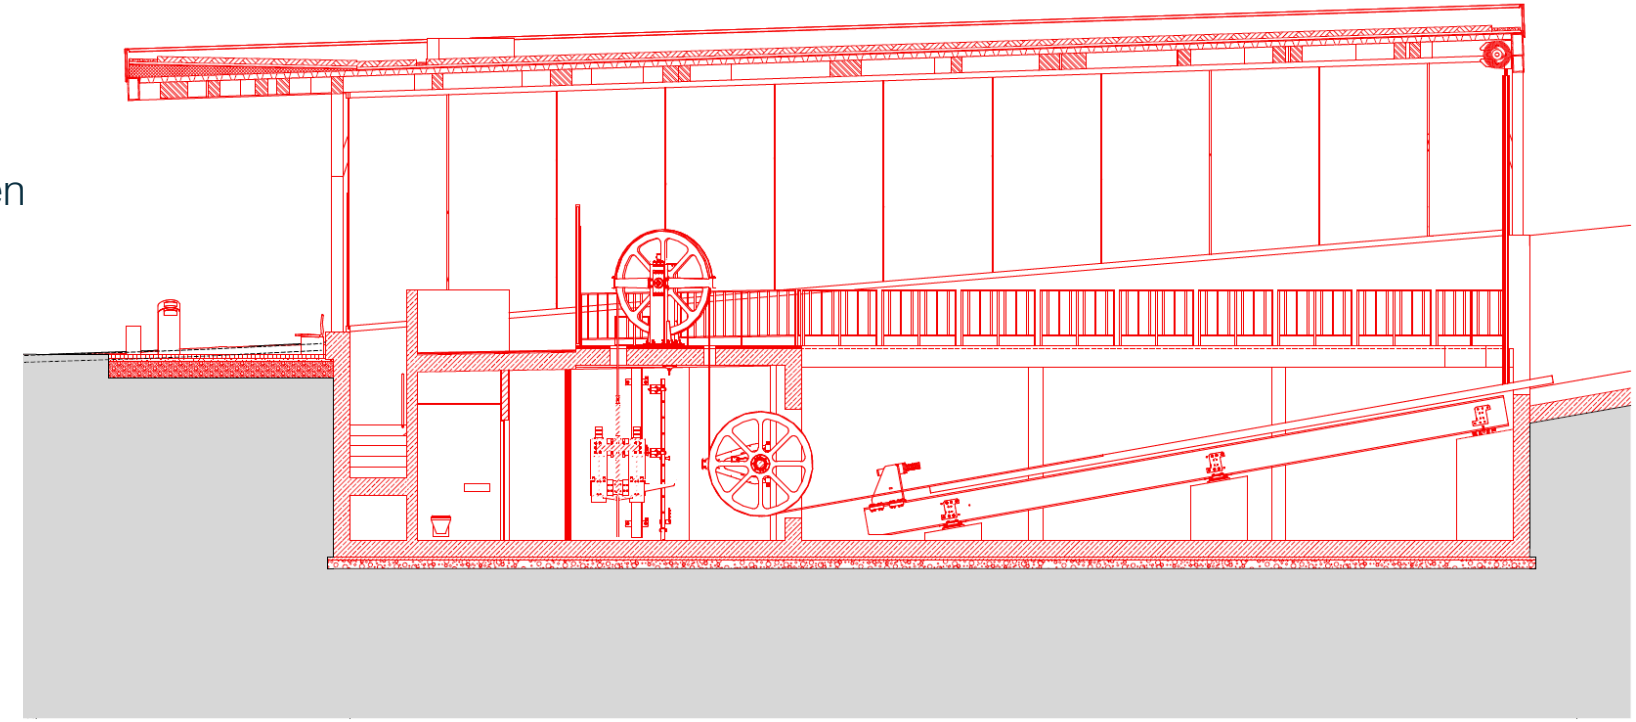

Längsschnitt Talstation

Verkehrssicherung Talstation / Leitungsverlegung


Januar 2027 – März 2027

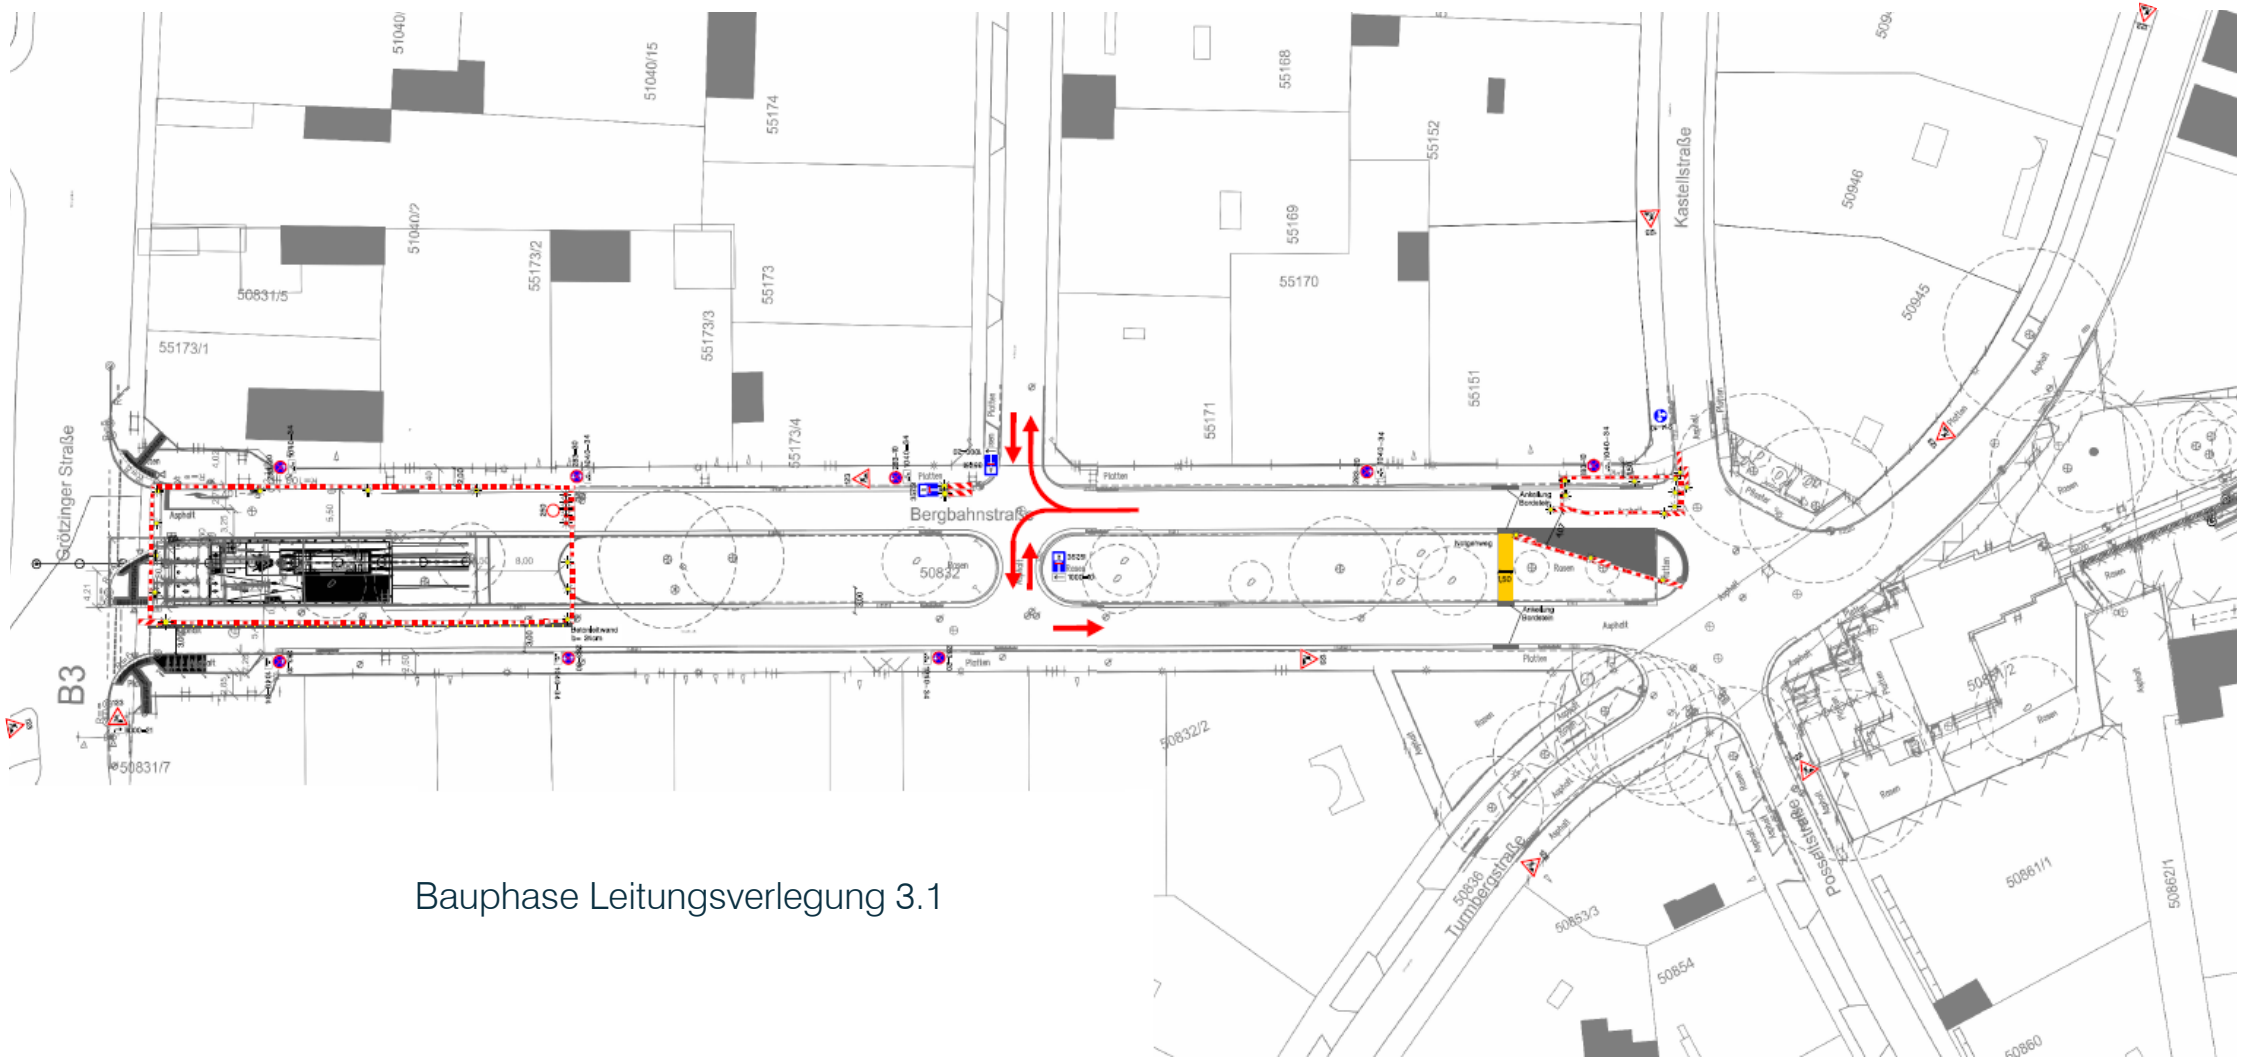

Bauphase Leitungsverlegung 3.1

Verkehrssicherung Talstation / Leitungsverlegung


Januar 2027 – März 2027

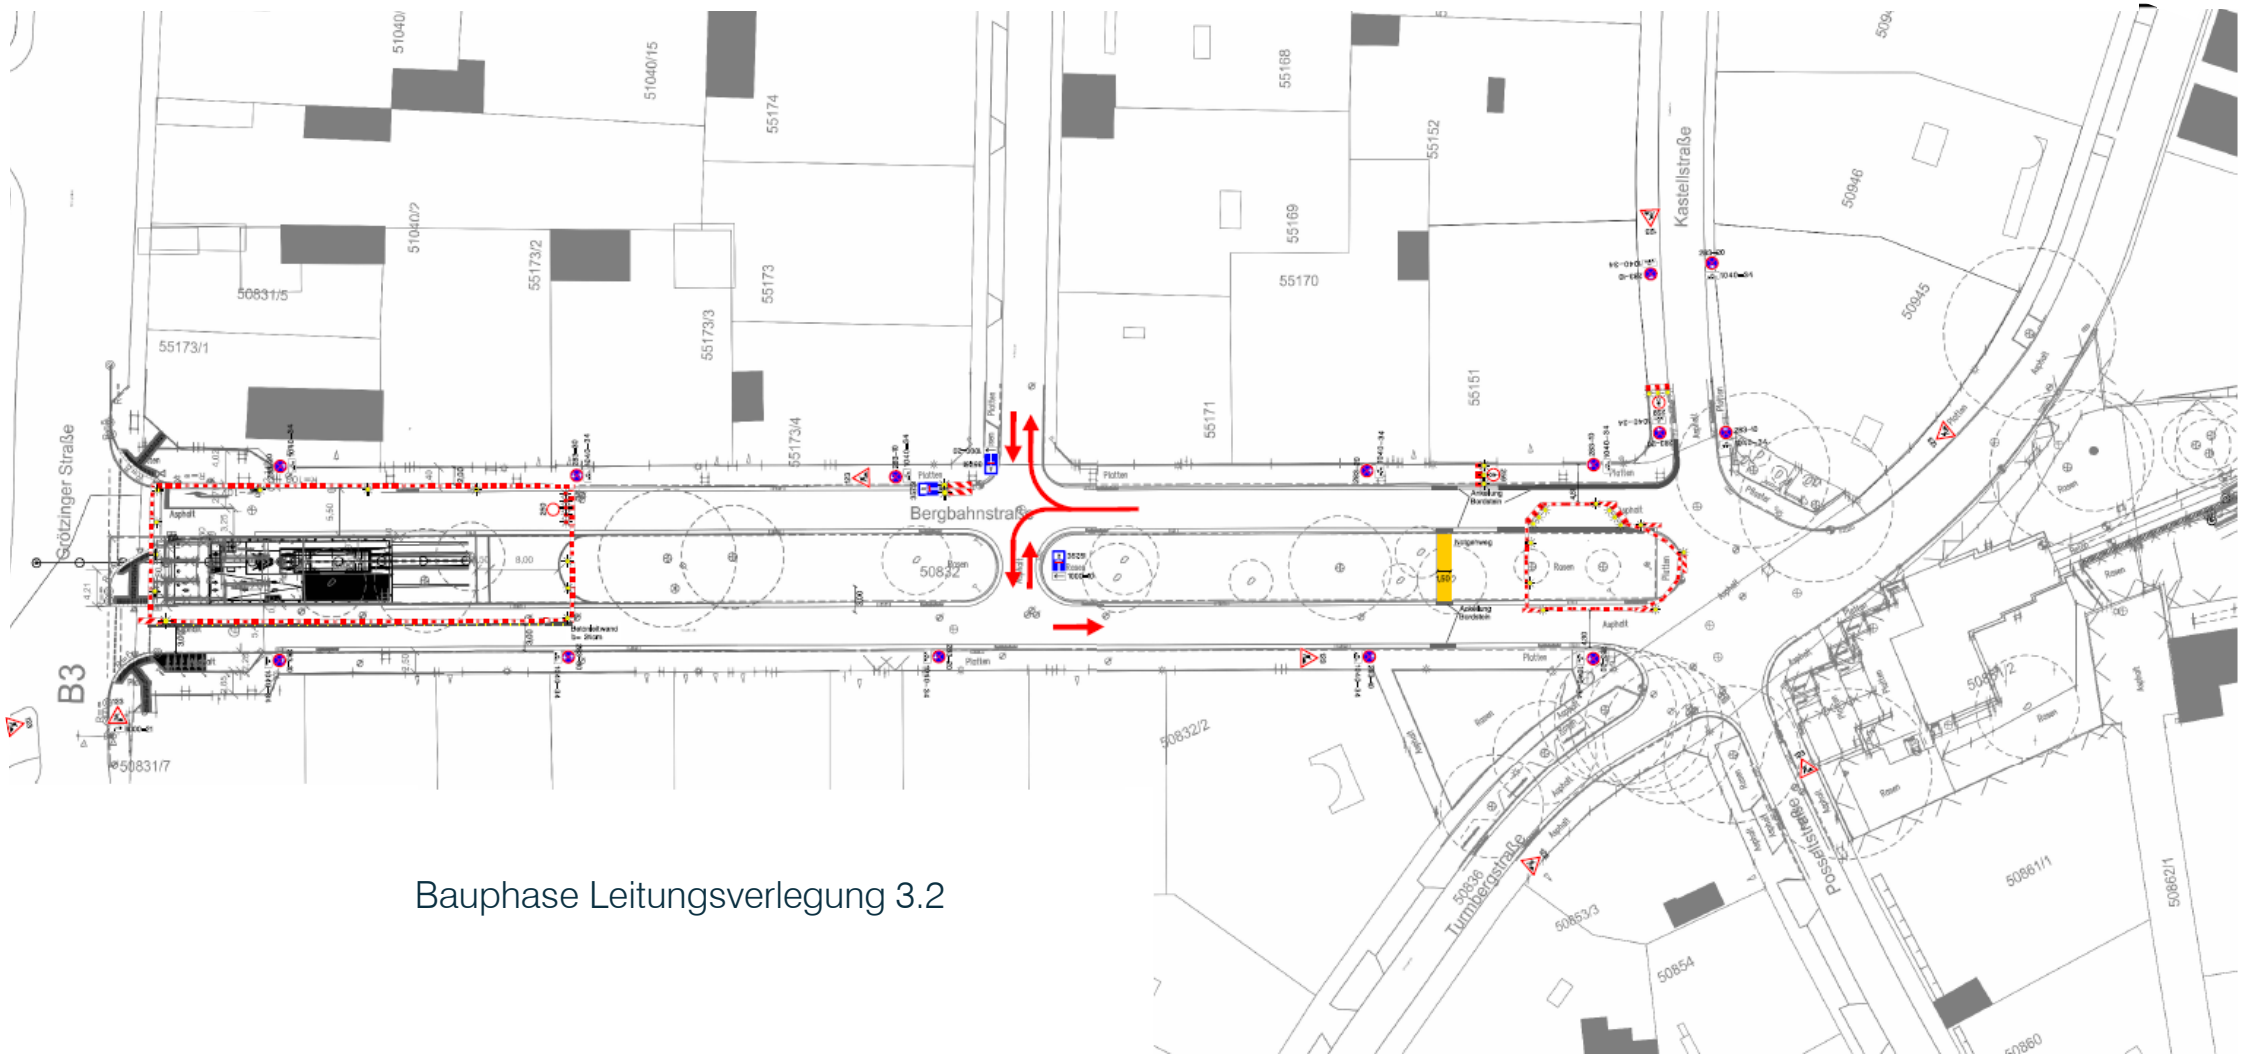

Bauphase Leitungsverlegung 3.2

Verkehrssicherung Talstation / Leitungsverlegung

Januar 2027 – März 2027

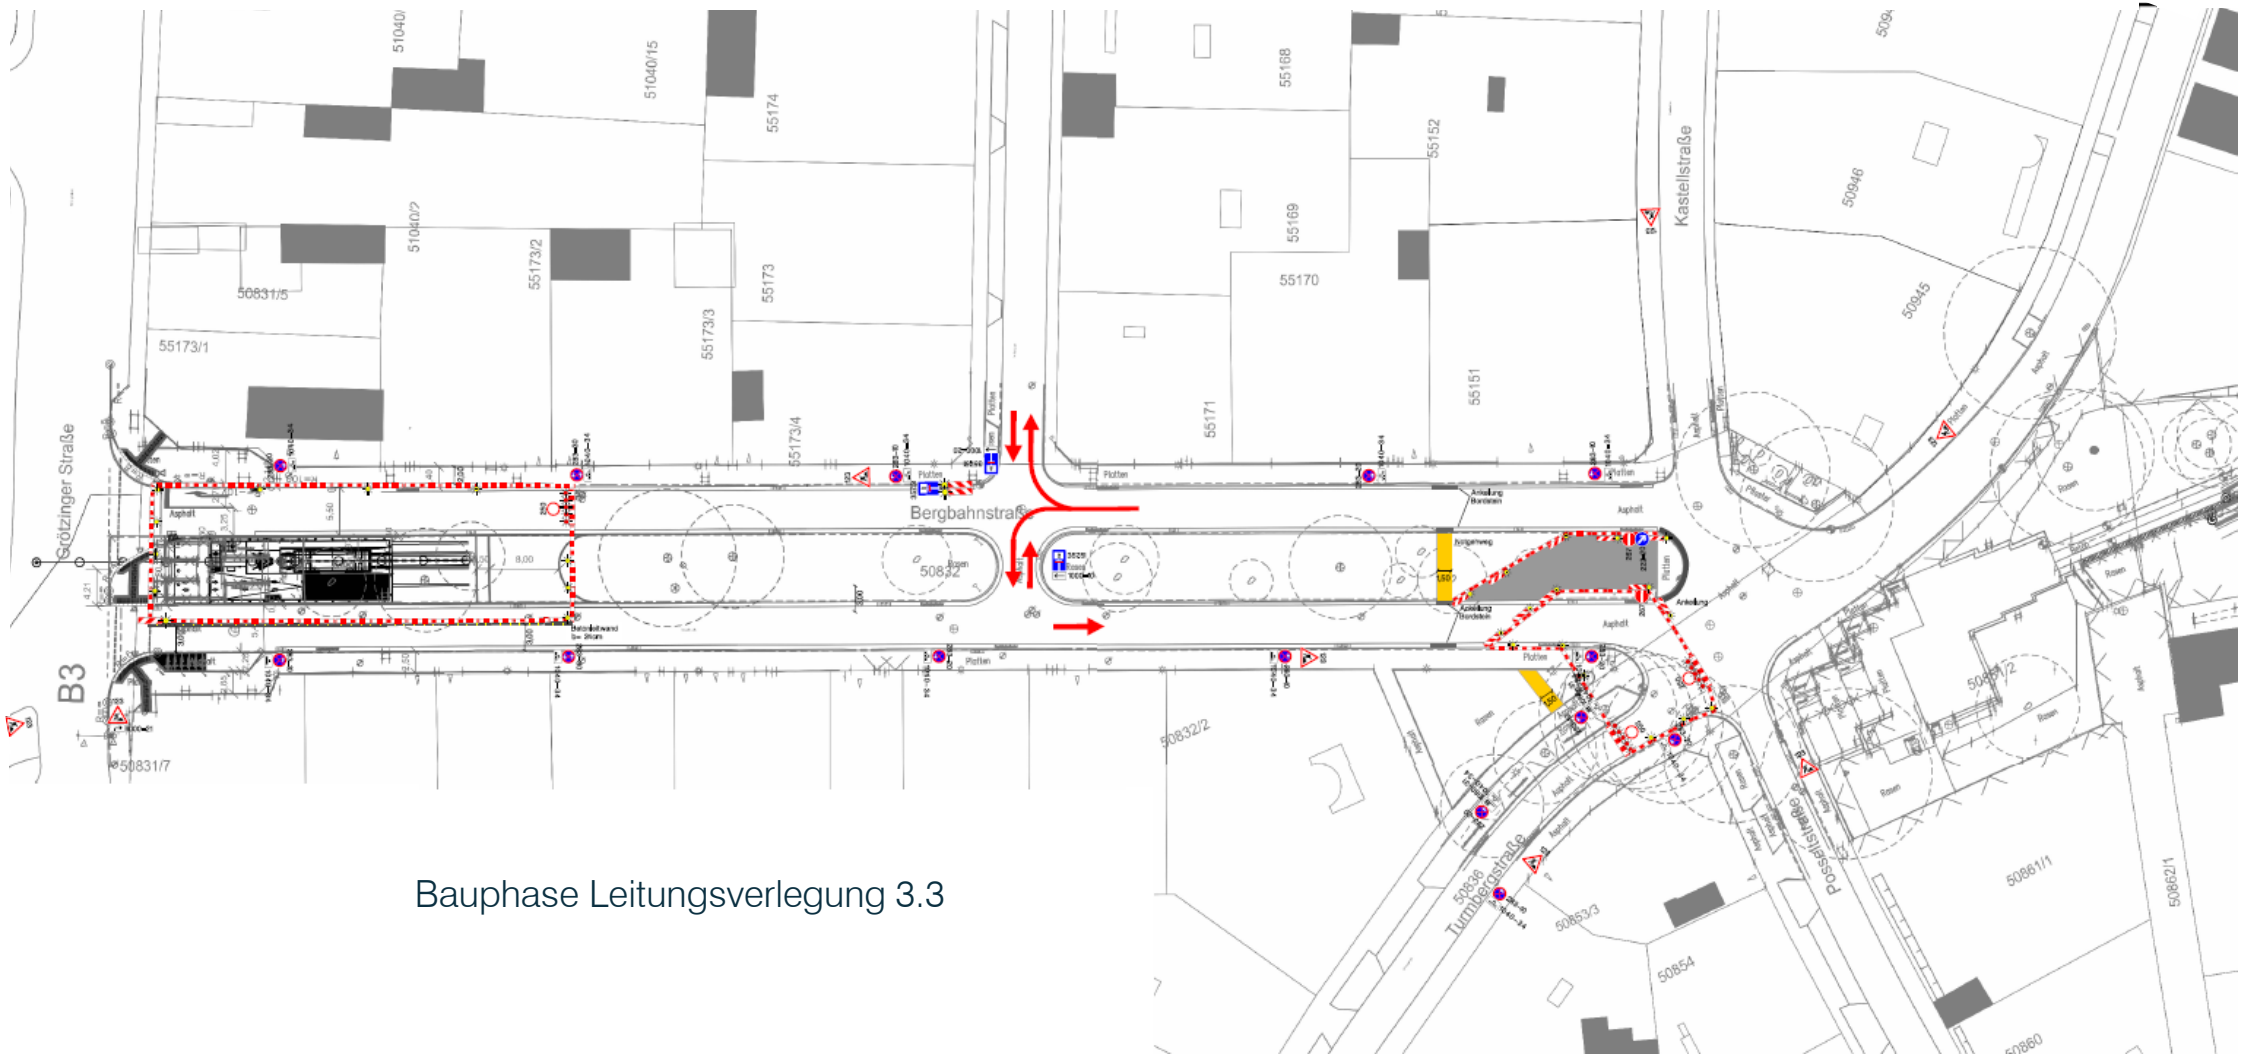

Bauphase Leitungsverlegung 3.3


Baufeld 2: Bergbahnstraße und Unterführung

April 2027 – Oktober 2027




Baustelleneinrichtung Bergbahnstraße und Unterführung

April 2027 – September 2027

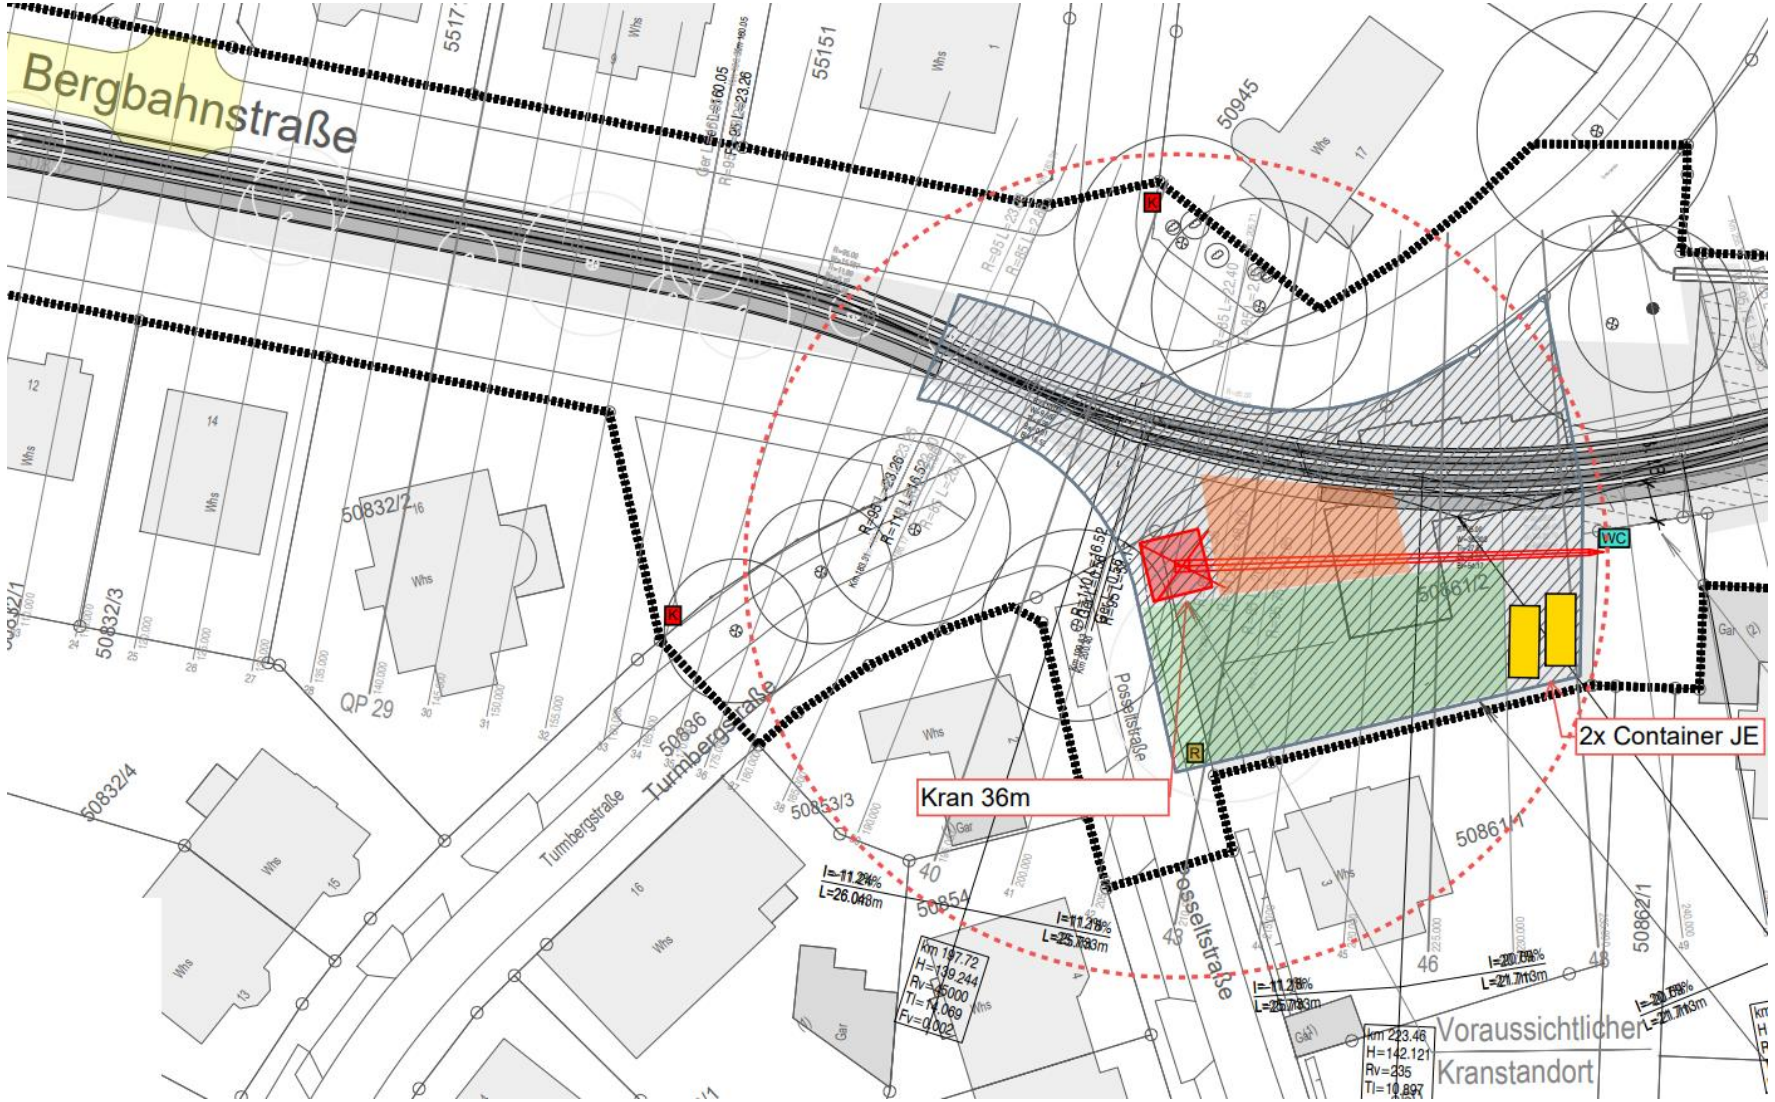

Arbeiten für Verbau mit Vernagelung Unterführung

April 2027 – Mai 2027

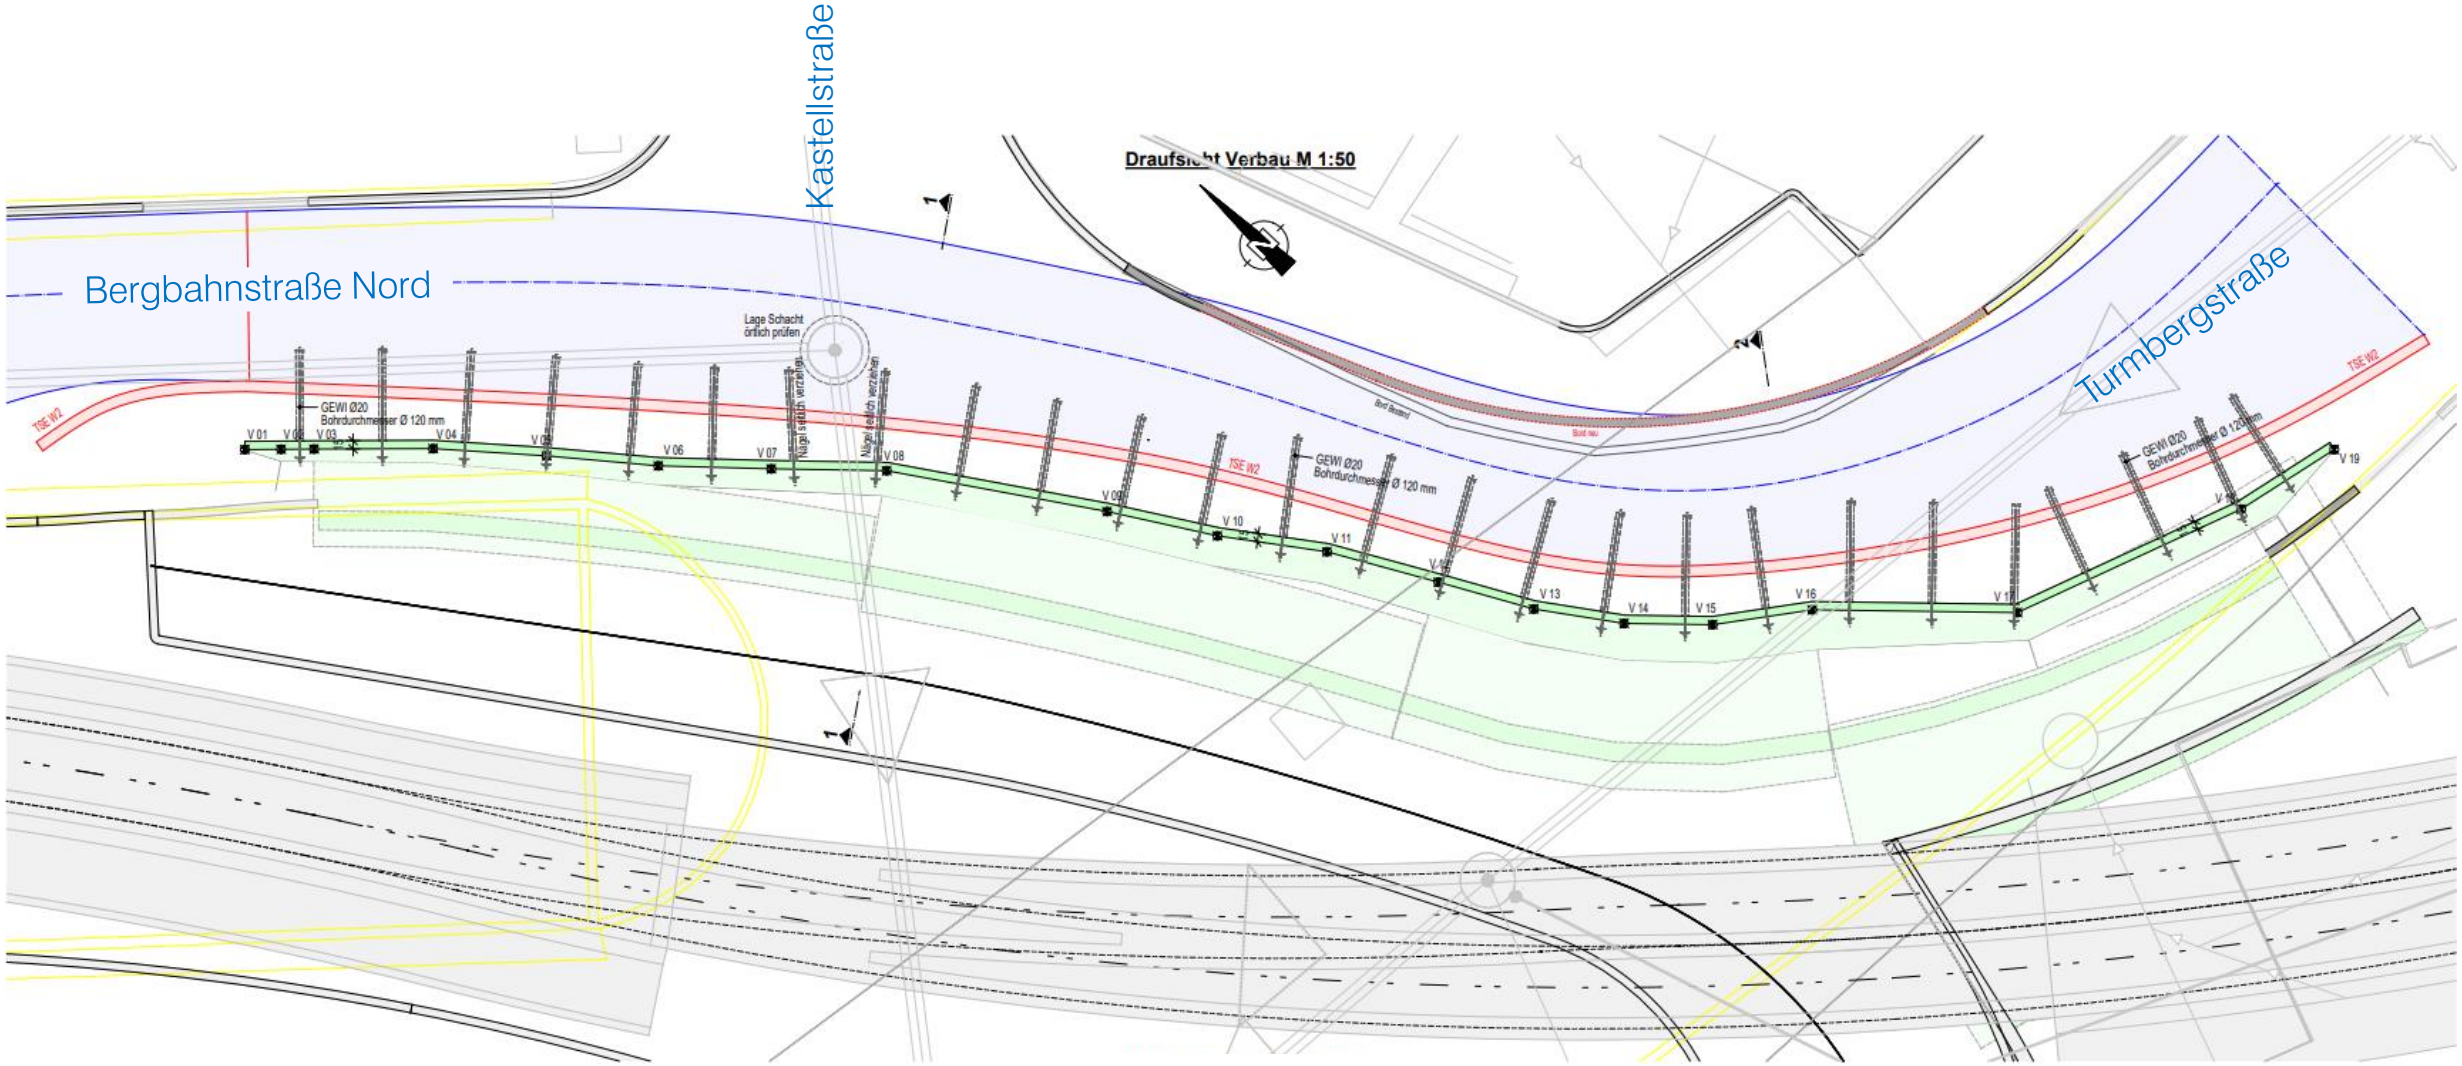

Baugeräte für Bergbahnstraße und Unterführung

April 2027 – September 2027


Erdarbeiten Trasse, Unterführung und Stützwände

- Verbau: Herstellung Bohrungen für Verbau, Rückverankerung mit Bohrgerät ca. 15to
  Sicherung Verbau mit Spritzbeton:
  Kompressor ca. 2to, Spritzgerät ca. 4to, Silo
- Aushub Trasse: Mit Mobilbagger ca. 20to
- Aushub Unterführung und Stützwände: Mit Kettenbagger ca. 22to
- Abfuhr Aushub: LKW 4-Achser ca. 32to
- Kleingeräte: Radlader ca. 5to
- Verdichtung Untergrund: Rüttelplatten und Stampfer bis 1to


Betonbau neue Unterführung, Brückenwiderlager & Stützwände

- Schnellmontagekran mit Ausladung 36m
- Radlader mit ca. 5to
- LKW-Fahrmischer 4-Achser ca. 32to
- Betonpumpe ca. 32to

Betontrasse Bergbahnstraße




Längsschnitt



Querschnitt

Verkehrssicherung Bergbahnstraße und Unterführung

April 2027 – Oktober 2027

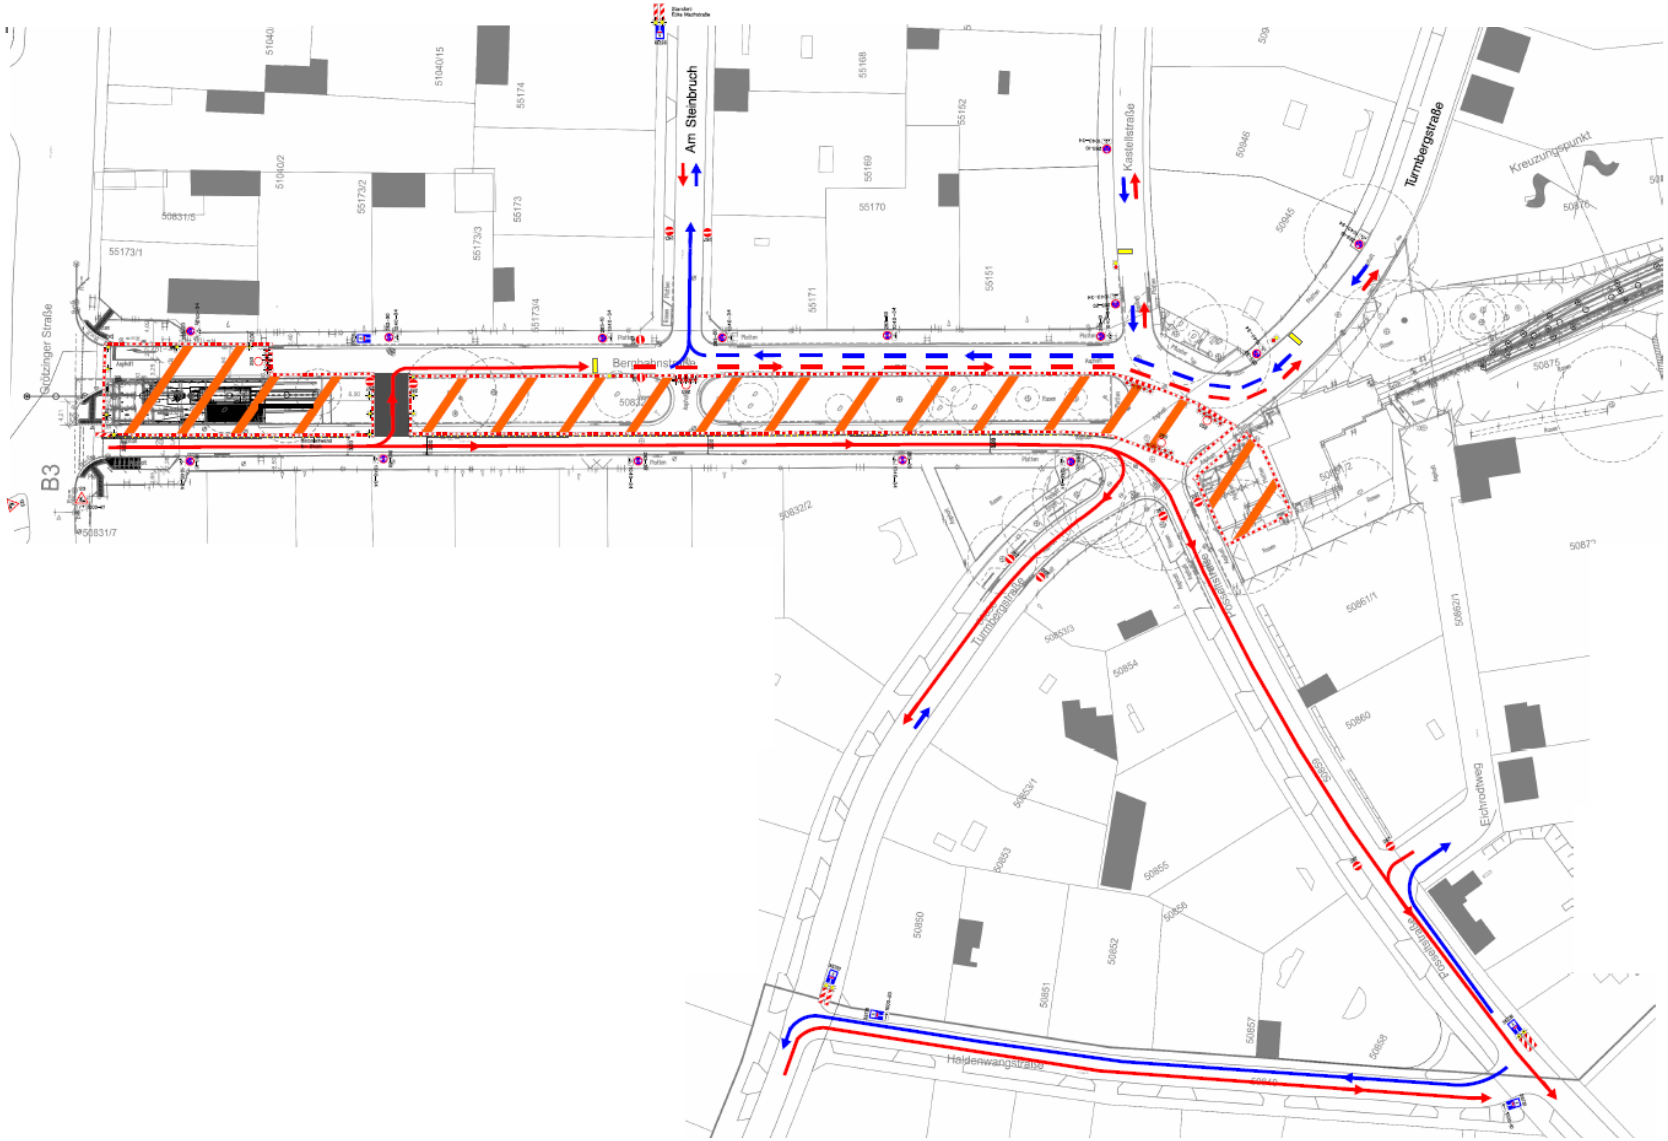


Baufeld 3: Dreischienenbereich und Ausweiche

März 2027 – September 2027


Garaventa

Wolfweg

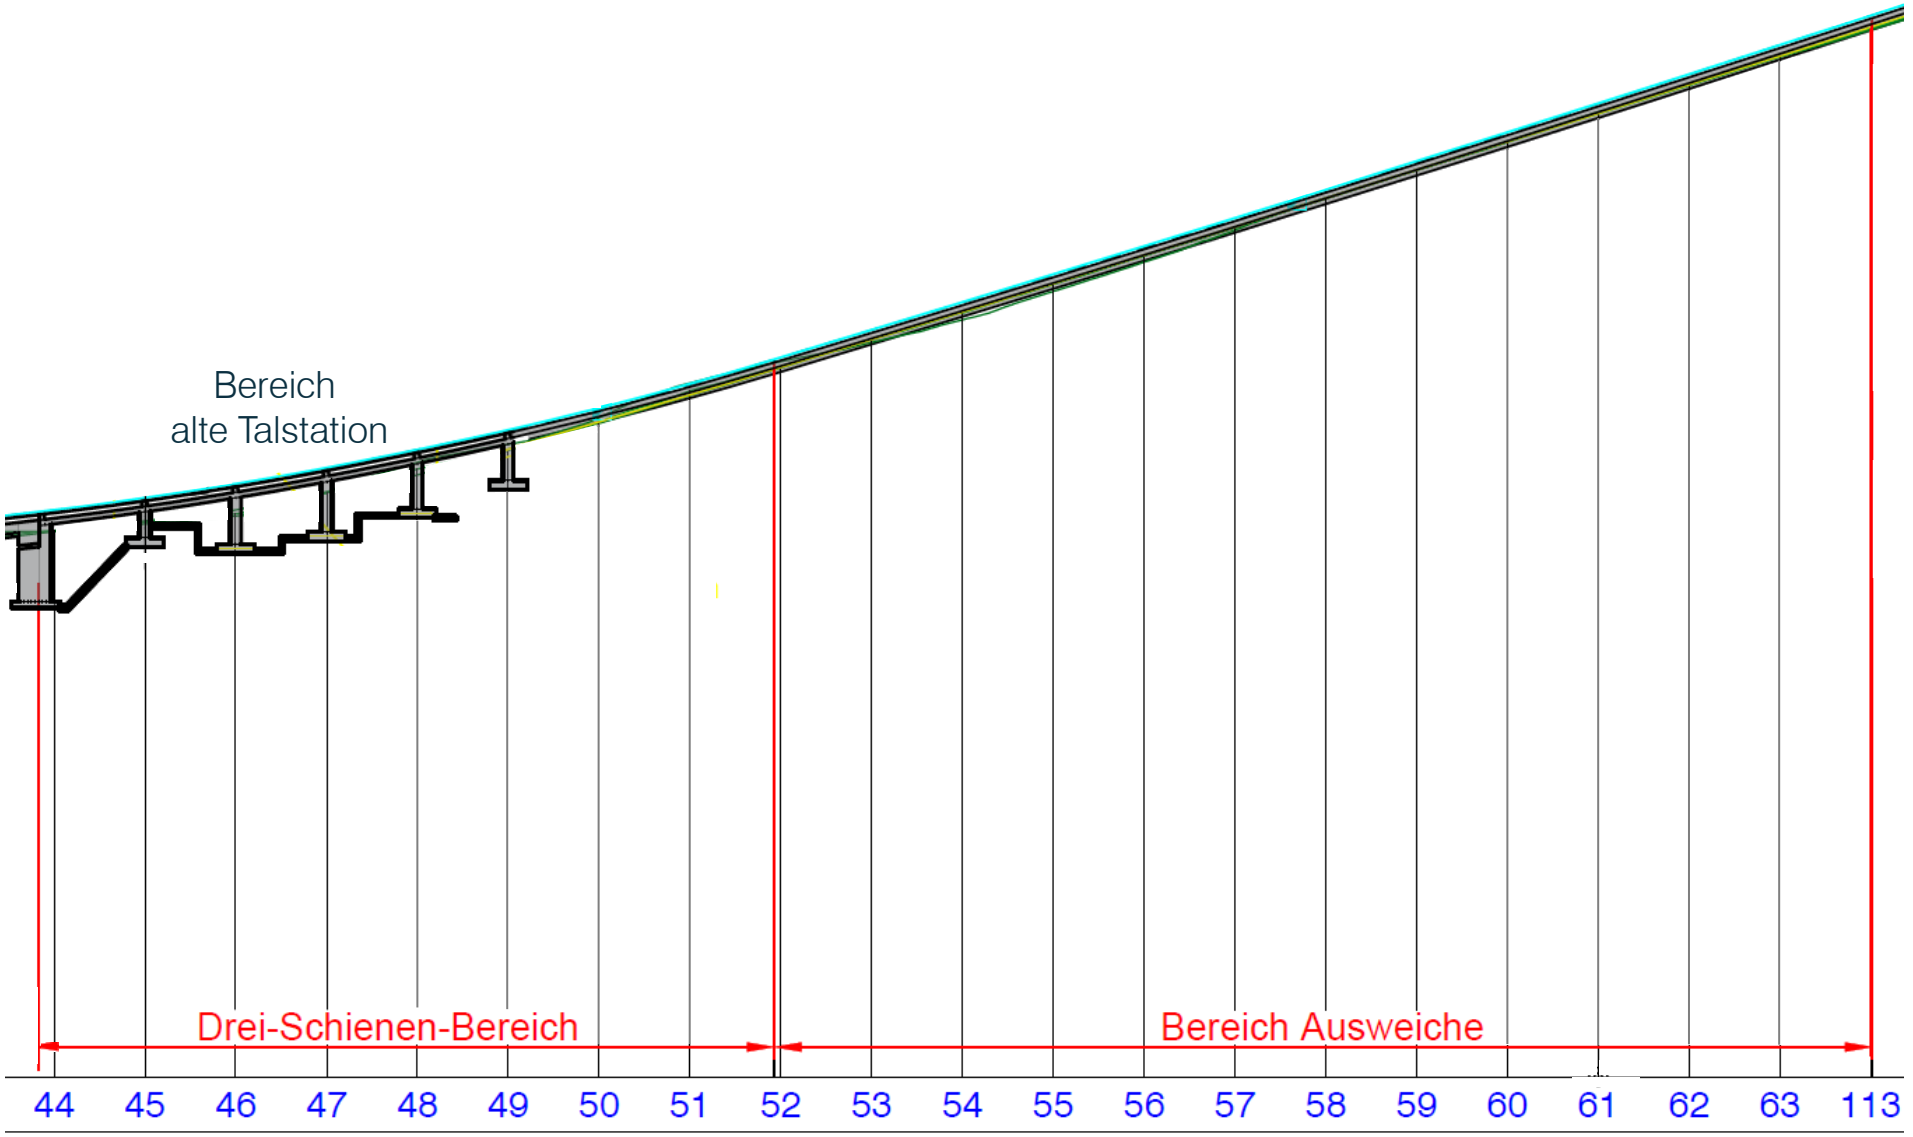

Baustelleneinrichtung Dreischienenbereich und Ausweiche

März 2027 – September 2027

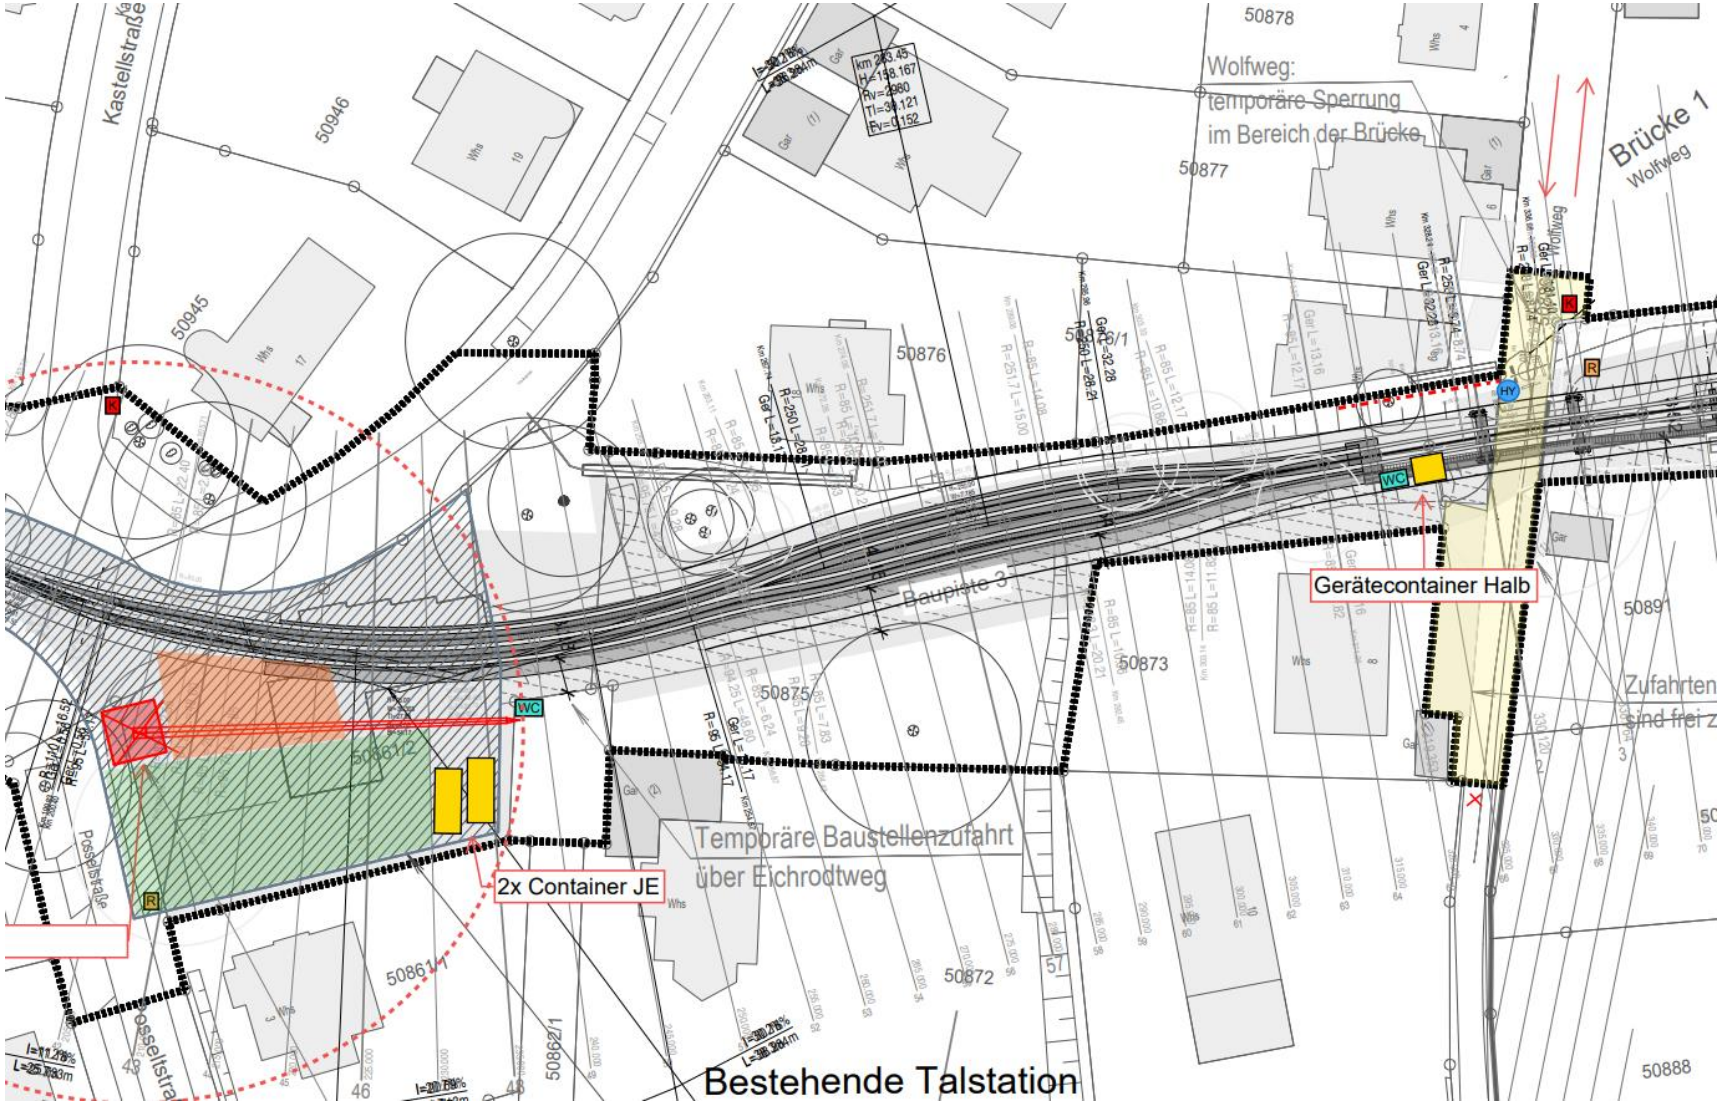

- Zufahrt/Ausfahrt eingeschränkt
- Schutzzaun
- Zufahrtsrichtungen
- Be- und Entladefläche
- Zufahrtswege
- Materiallagerfläche
- Ursprüngliche BE-Fläche
- WC Mobile Baustellentoilette
- R Schaltschrank ENBW
- R Stromverteiler Reif
- HY Unterflurhydrant

Legende

- BE-Flächen
- Planfeststellungsgrenze
- Aushubbereich Berg
- Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.12.012
- Wasserschutzgebiet Nr. 212.010, Zone IIIB
- Baubereich
- Baugrubensicherung
- Einfahrten Privatparzellen
- Baupiste
- Best. Bäume schützen
- Rodung Bäume, Sträucher, Gehölze
- Blaueinträge

Baugeräte für Dreischienenbereich und Ausweiche

März 2027 – Juli 2027


Erdarbeiten Trasse

- Aushub Trasse: Mit Kettenbagger ca. 8to bis 20to
- Aushub Brücken: Mit Kettenbagger ca. 8to
- Abfuhr Aushub: LKW 4-Achser ca. 32to
- Kleingeräte: Radlader ca. 5to
- Verdichtung Untergrund: Rüttelplatten und Stampfer bis 1to

Betonbau Trasse


- LKW-Fahrmischer 4-Achser ca. 32to
- Betonpumpe ca. 32to
- Teleskoplader ca. 5to

Betontrasse Dreischienenbereich

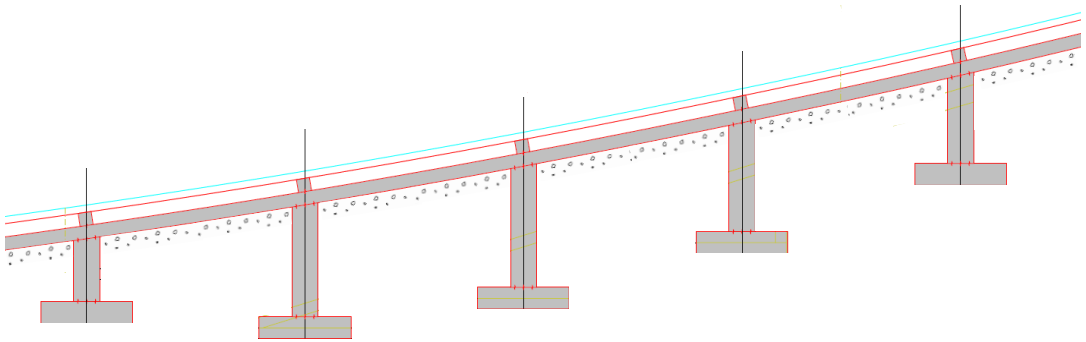

Längsschnitt


Betontrasse Ausweiche



Querschnitt


Verkehrssicherung Dreischienenbereich und Ausweiche

März 2027 – September 2027

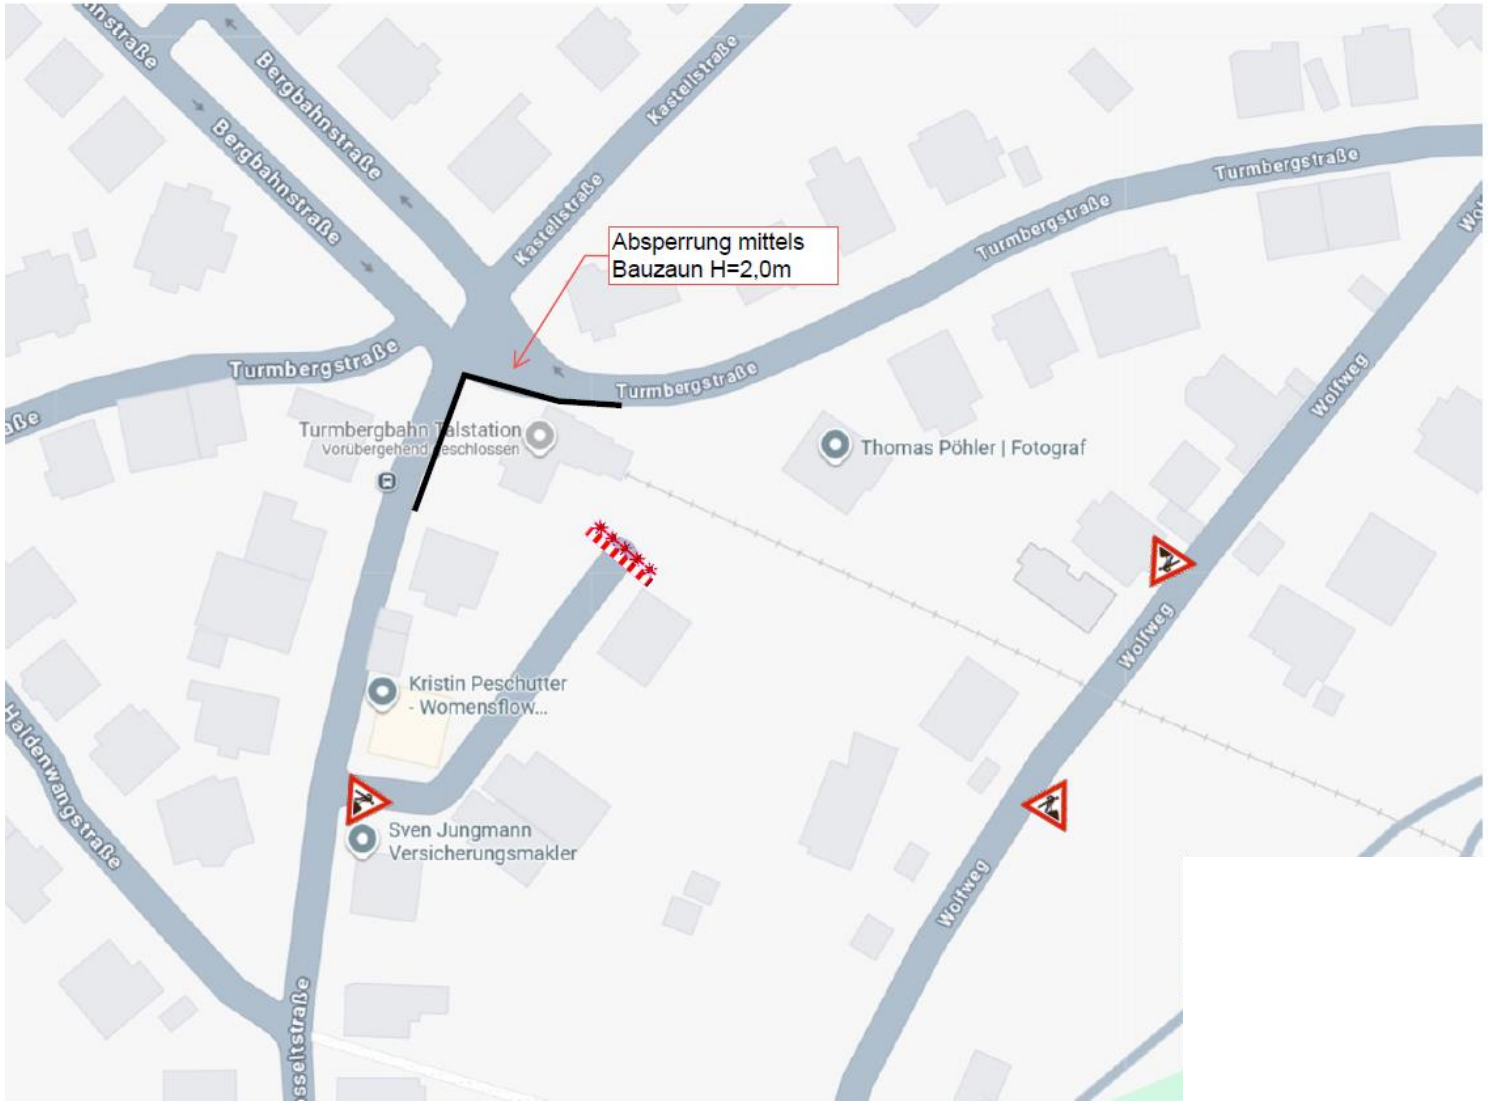


Baufeld 4 und 5: Wolfweg - Bergstation

November 2026 – Juli 2027

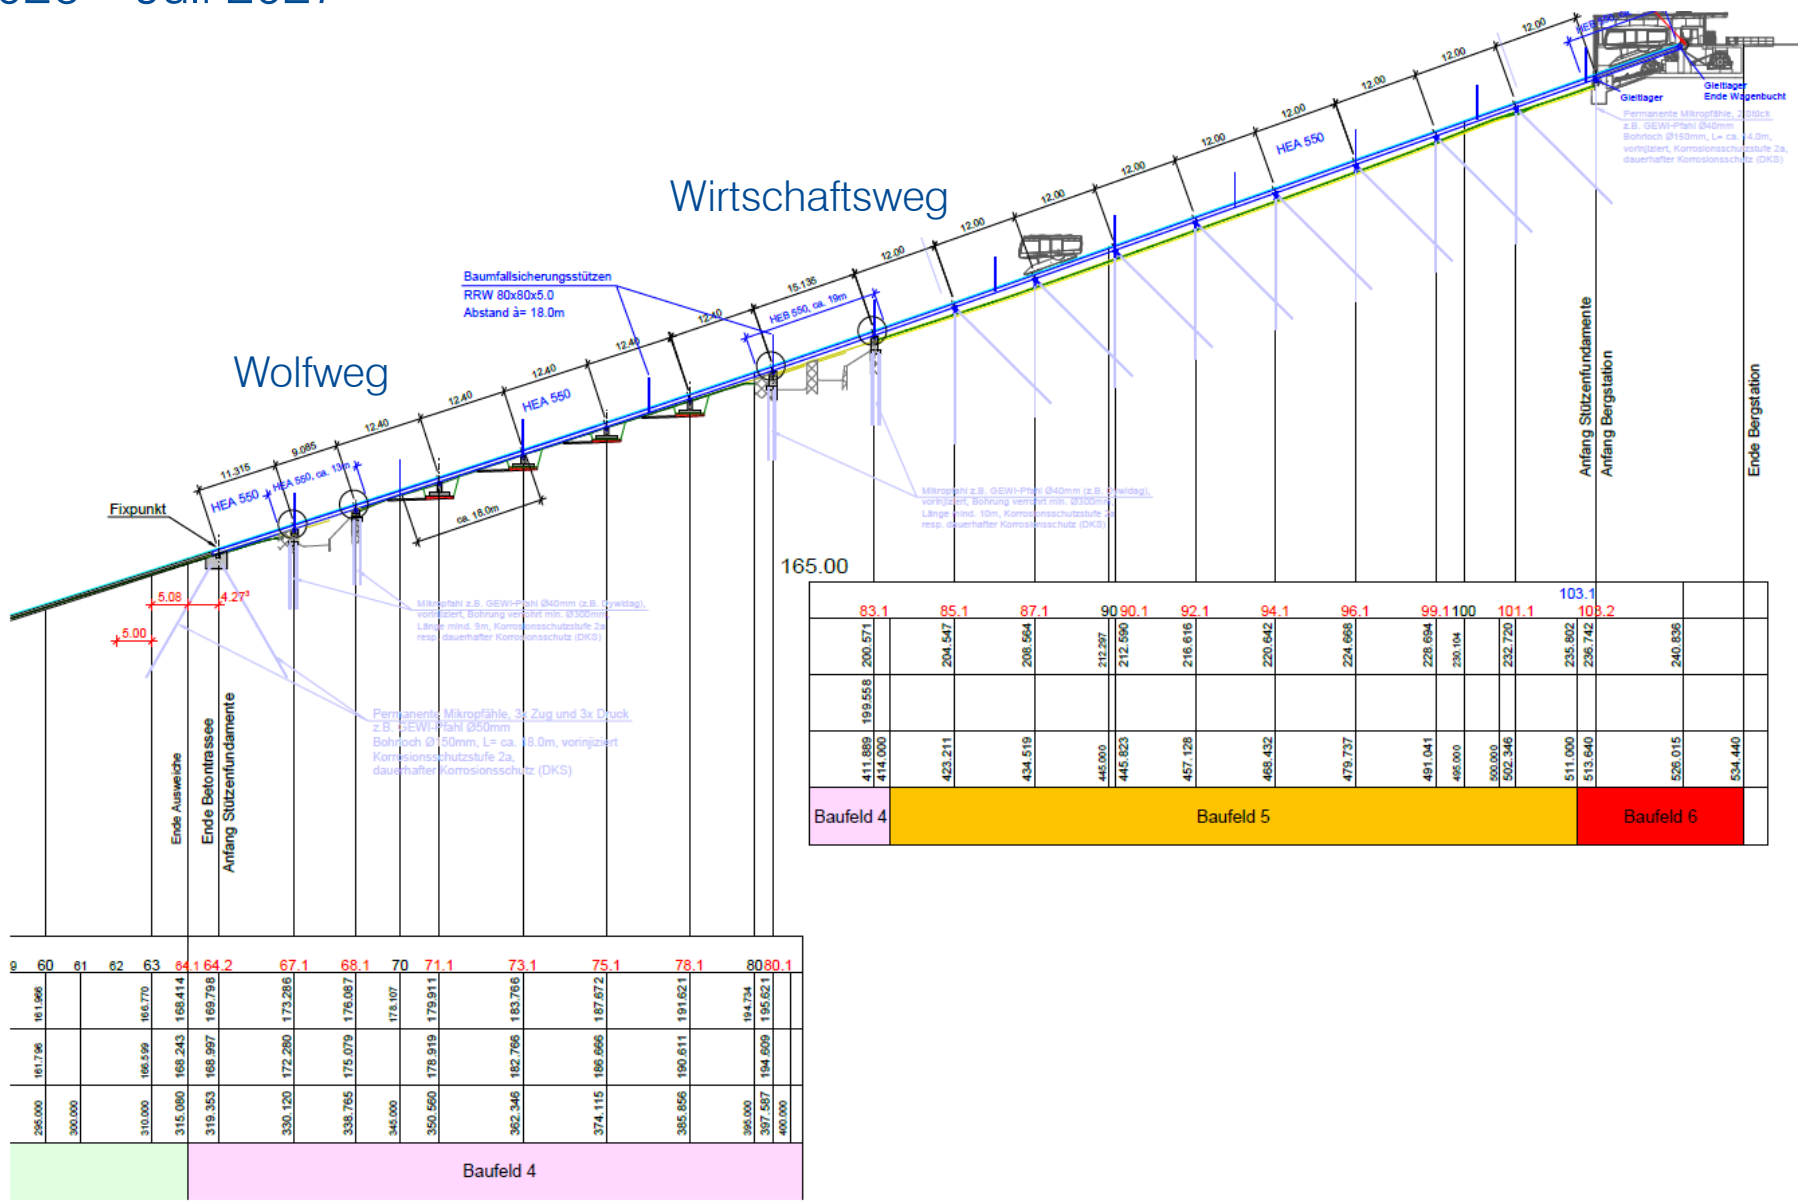

Baustelleneinrichtung Wolfweg - Bergstation

November 2026 – Juli 2027

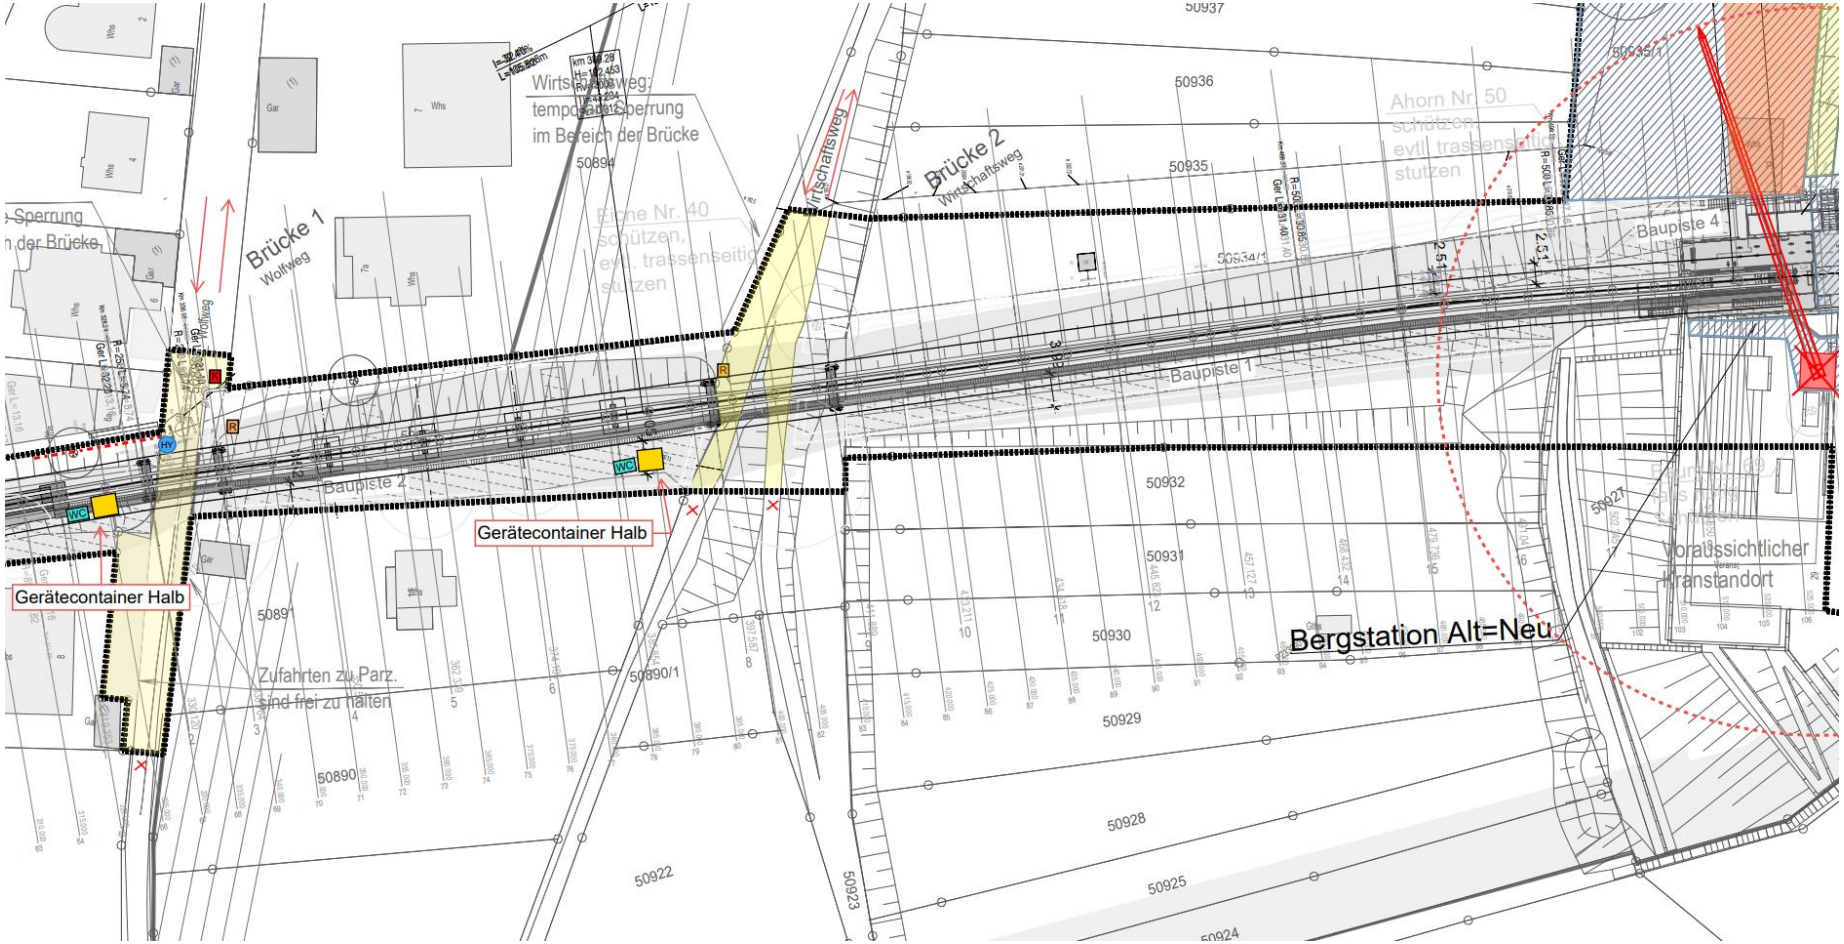

- Zufahrt/Ausfahrt eingeschränkt
- Schutzzaun
- Zufahrtsrichtungen
- Be- und Entladefläche
- Zufahrtswege
- Materiallagerfläche
- Ursprüngliche BE-Fläche
- WC Mobile Baustellentoilette
- R Schaltschrank ENBW
- R Stromverteiler Reif
- HY Unterflurhydrant

Legende

- BE-Flächen
- Planfeststellungsgrenze
- Aushubbereich Berg
- Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.12.012
- Wasserschutzgebiet Nr. 212.010, Zone IIIB
- Baubereich
- Baugrubensicherung
- Einfahrten Privatparzellen
- Baupiste
- Best. Bäume schützen
- Rodung Bäume, Sträucher, Gehölze
- Blaueinträge

Baugeräte für Wolfweg - Bergstation


November 2026 – April 2027

Erdarbeiten Trasse


- Aushub Trasse: Mit Kettenbagger ca. 8to bis 20to
- Abfuhr Aushub: LKW 4-Achser ca. 32to
- Kleingeräte: Radlader ca. 5to
- Verdichtung Untergrund: Rüttelplatten und Stampfer bis 1to

Betonbau Trasse


- LKW-Fahrmischer 4-Achser ca. 32to
- Betonpumpe ca. 32to
- Teleskoplader ca. 5to

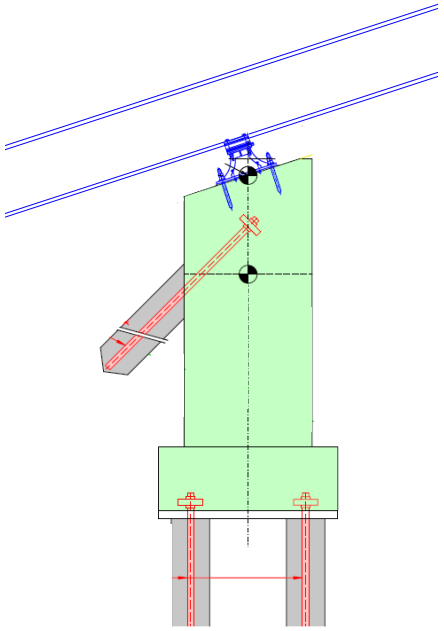

Widerlager Wolfweg

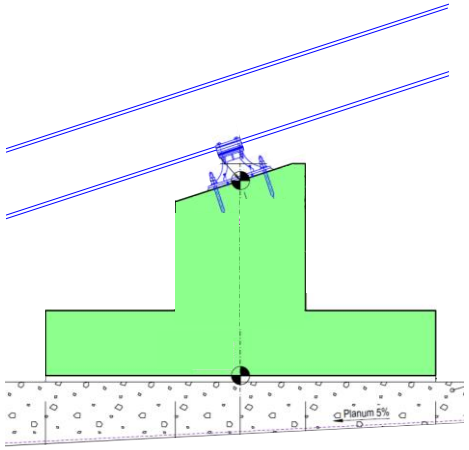

Einzelfundament
Baufeld 4

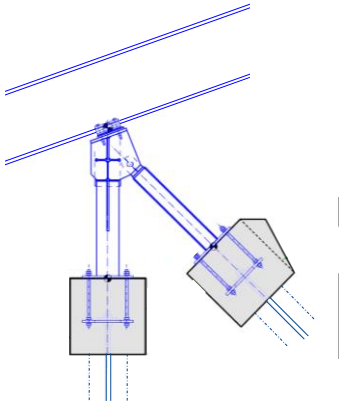

Verankerung mit Mikropfählen
Baufeld 5


Baugeräte für Mikropfähle Wolfweg - Bergstation

Januar 2027 – April 2027

Verankerungen und Gründungen über Mikropfähle

- Bohrgerät mit ca. 15to
- Kompressor mit ca. 4to




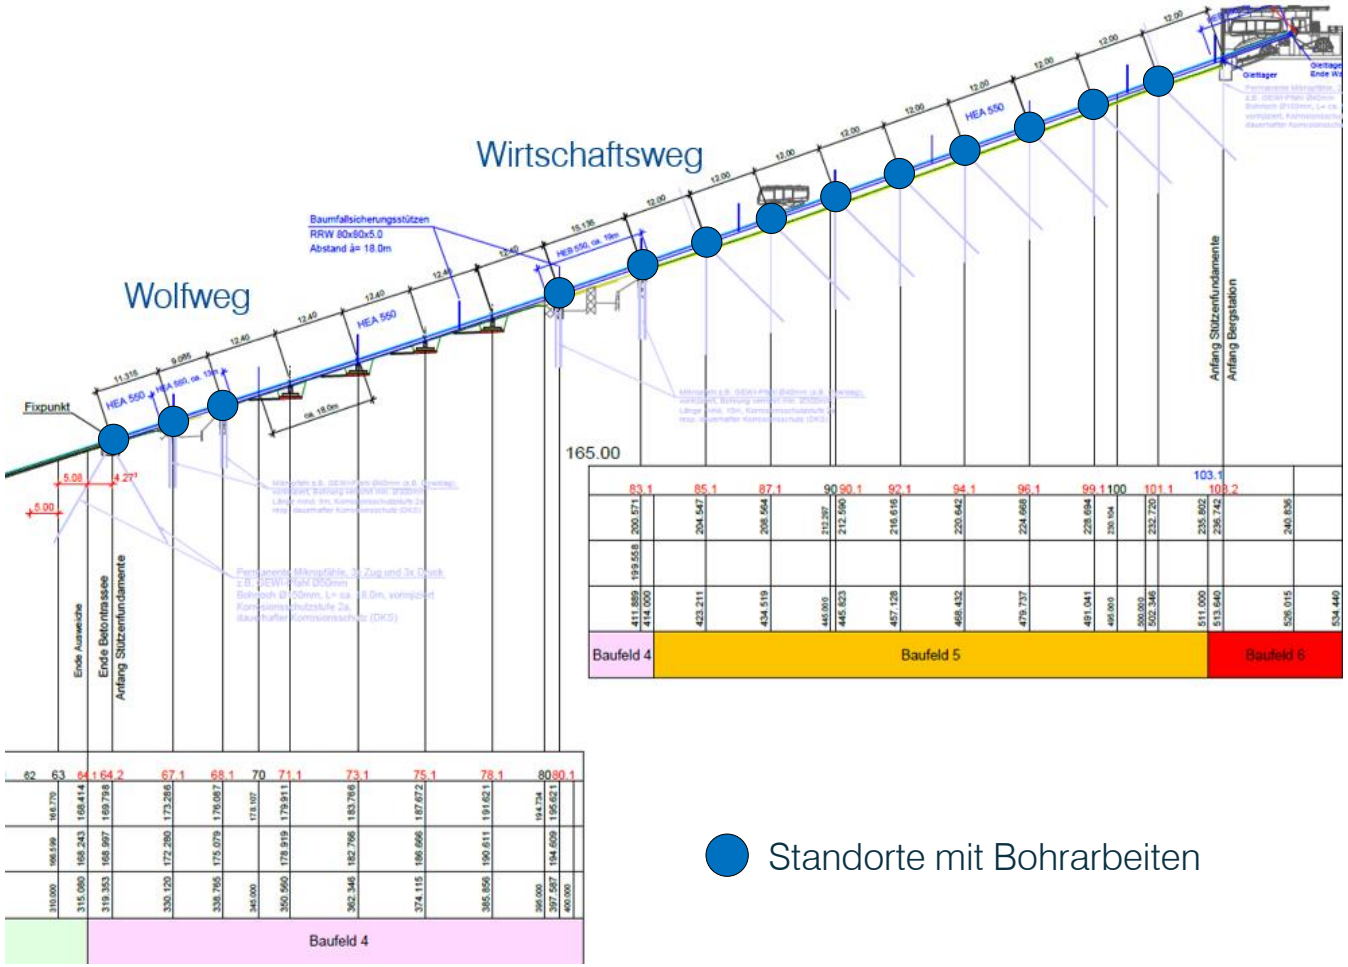

Verkehrssicherung Wolfweg - Bergstation

November 2026 – Juli 2027

„werktags 7-18h“

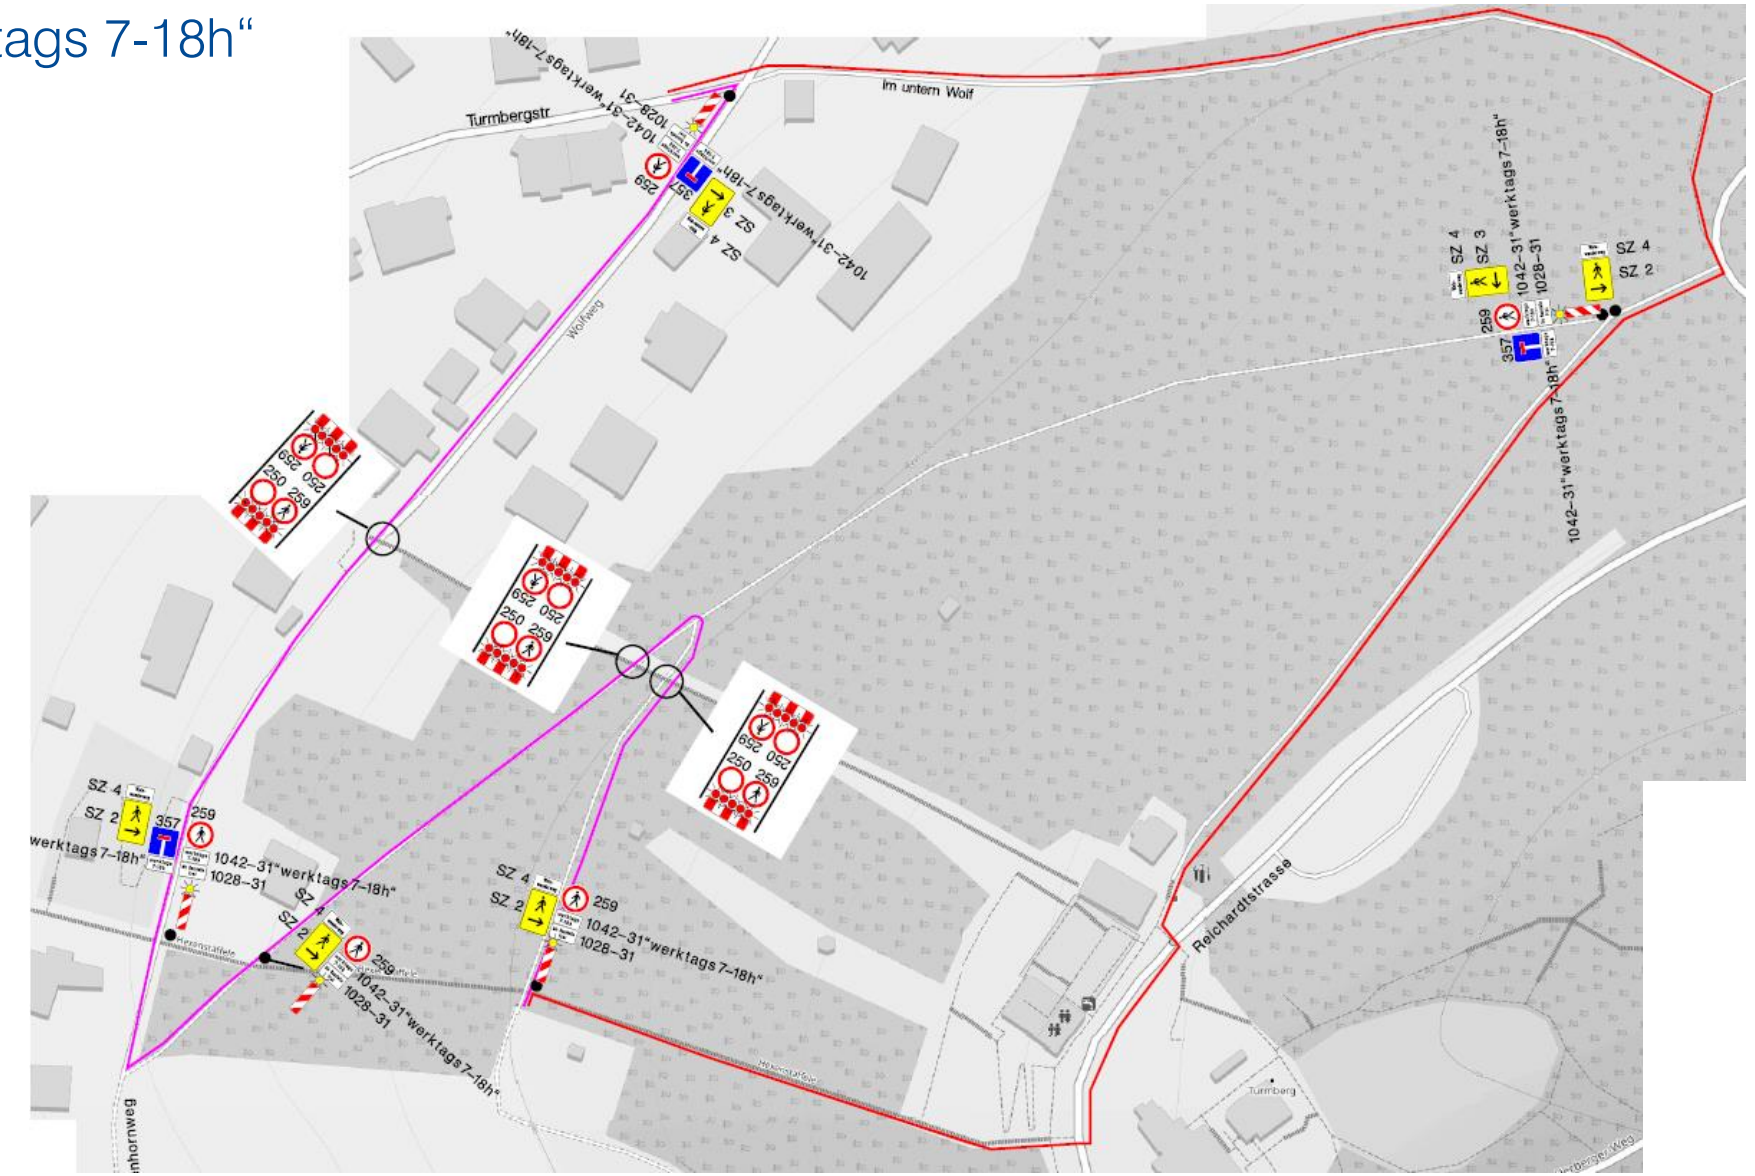

Weinwanderweg (Abschnitt)

Weinwanderweg (Abschnitt)

bis Hexenstäffele frei — SZ 1

SZ 2

SZ 3

Wein-wanderweg — SZ 4


Baufeld 6: Bergstation

November 2026 – August 2027



Baustelleneinrichtung Bergstation

November 2026 – August 2027

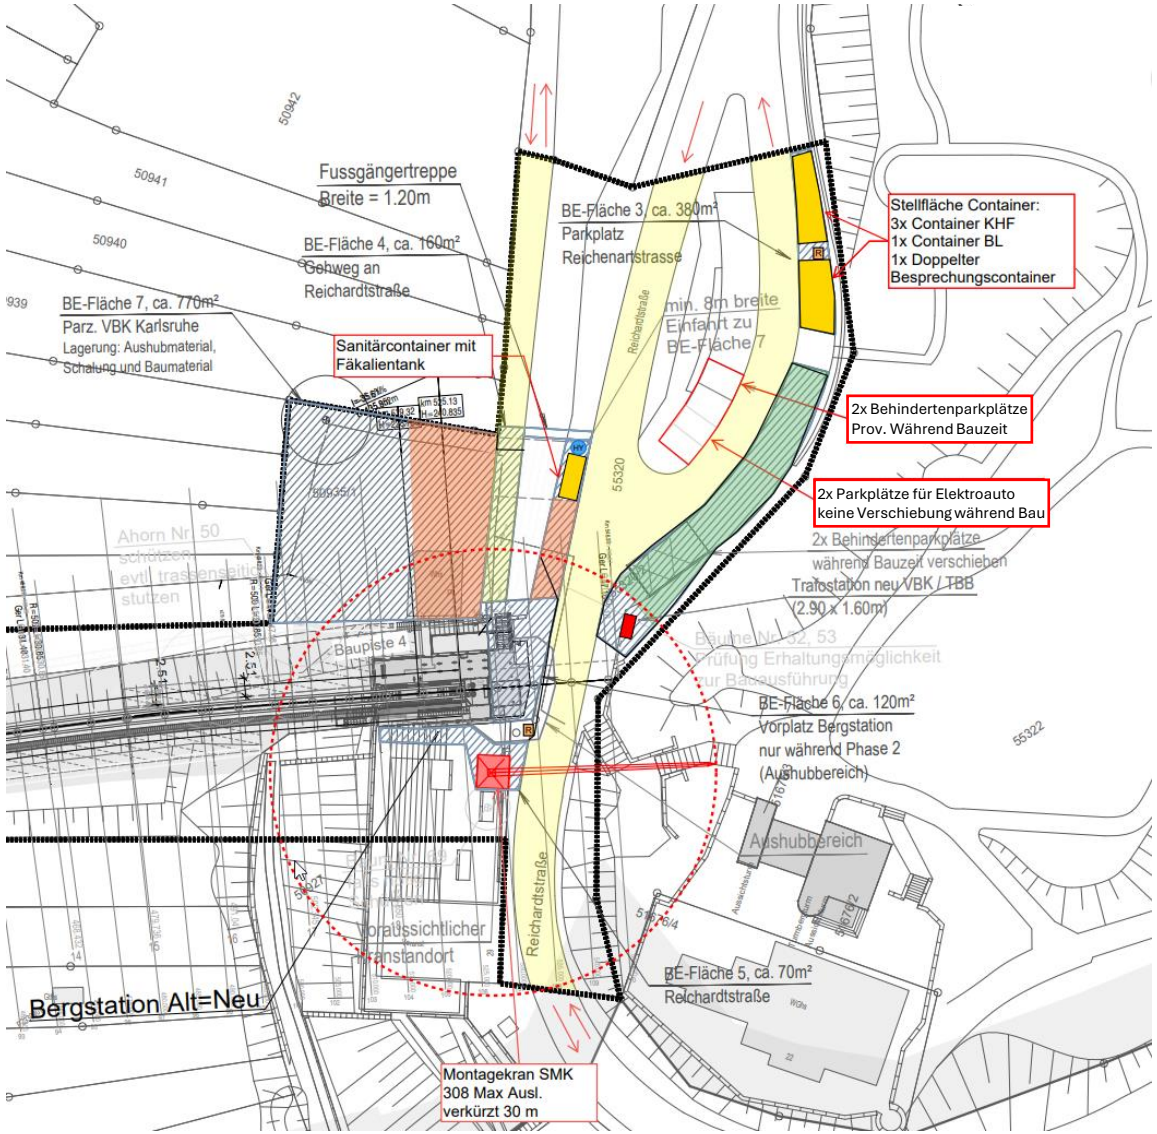

- Zufahrt/Ausfahrt eingeschränkt
- Schutzzaun
- Zufahrtsrichtungen
- Be- und Entladefläche
- Zufahrtswege
- Materiallagerfläche
- Ursprüngliche BE-Fläche
- WC Mobile Baustellentoilette
- Schaltschrank ENBW
- R Stromverteiler Reif
- HY Unterflurhydrant

Legende

- BE-Flächen
- Planfeststellungsgrenze
- Aushubbereich Berg
- Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.12.012
- Wasserschutzgebiet Nr. 212.010, Zone IIIB
- Baubereich
- Baugrubensicherung
- Einfahrten Privatparzellen
- Baupiste
- Best. Bäume schützen
- Rodung Bäume, Sträucher, Gehölze
- Blaueinträge

Baugeräte für Bergstation

November 2026 – August 2027

Teilabbruch & Aushub


- Kettenbagger ca. 8to
- Verschiedene Betonsägen und Kernbohrgeräte
- Radlader ca. 5to
- Kompressor mit ca. 2to

Betonbau

- Schnellmontagekran mit Ausladung 30m
- Radlader ca. 5to.
- LKW-Beton Fahrmischer ca. 32to
- LKW-Betonpumpe ca. 32to

Hochbau


- Mobilkran ca. 60to
- Hebebühnen
- LKW

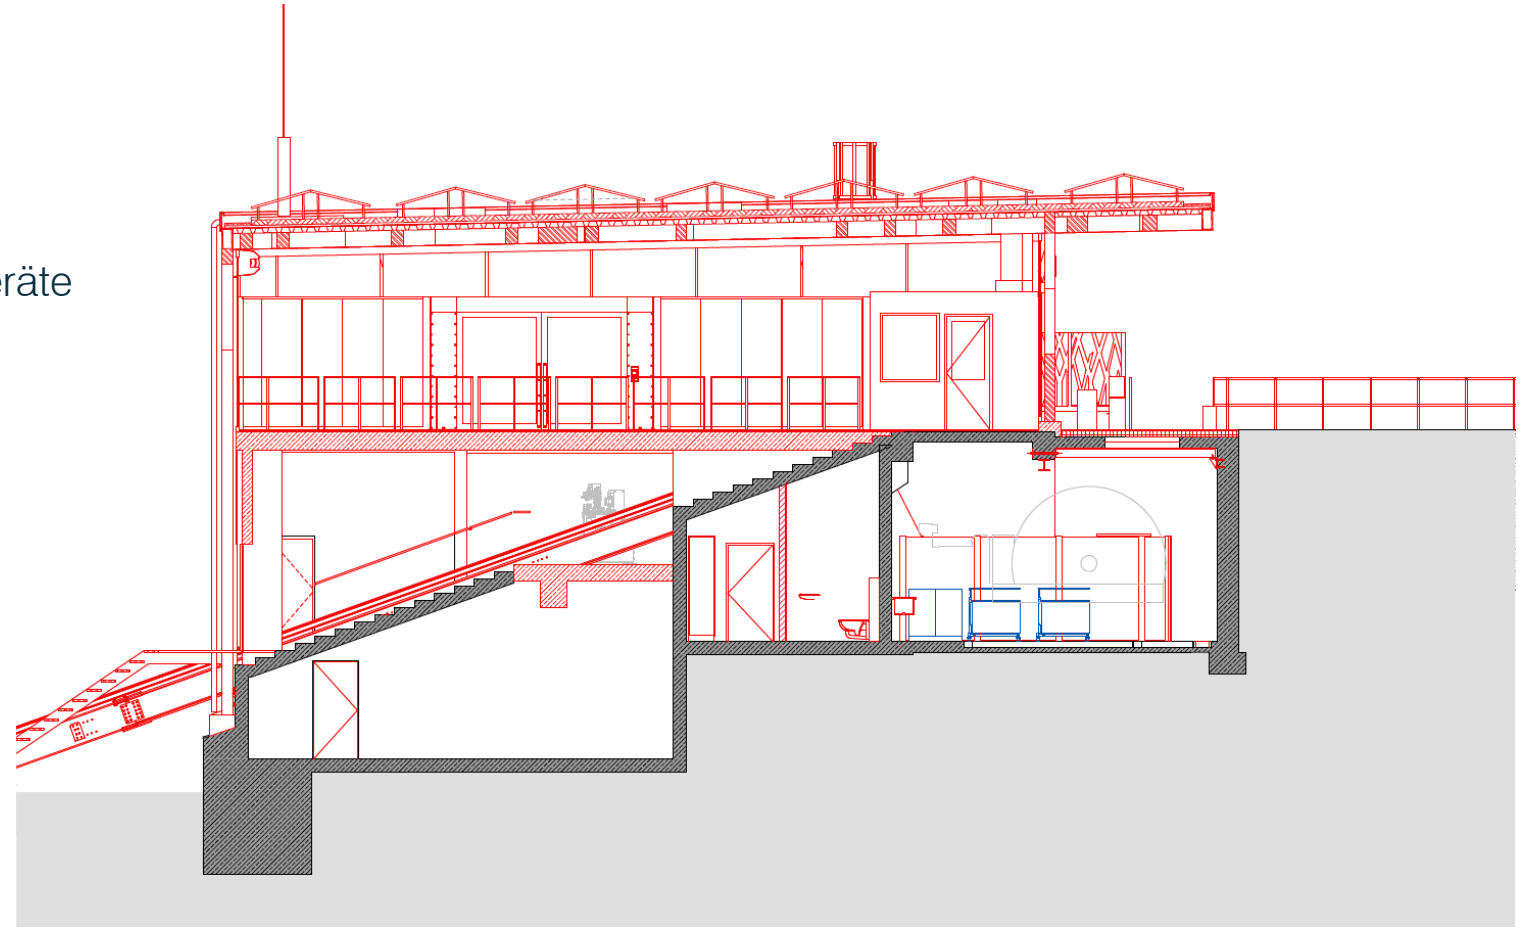

Längsschnitt Bergstation

Verkehrssicherung Bergstation

November 2026 – August 2027

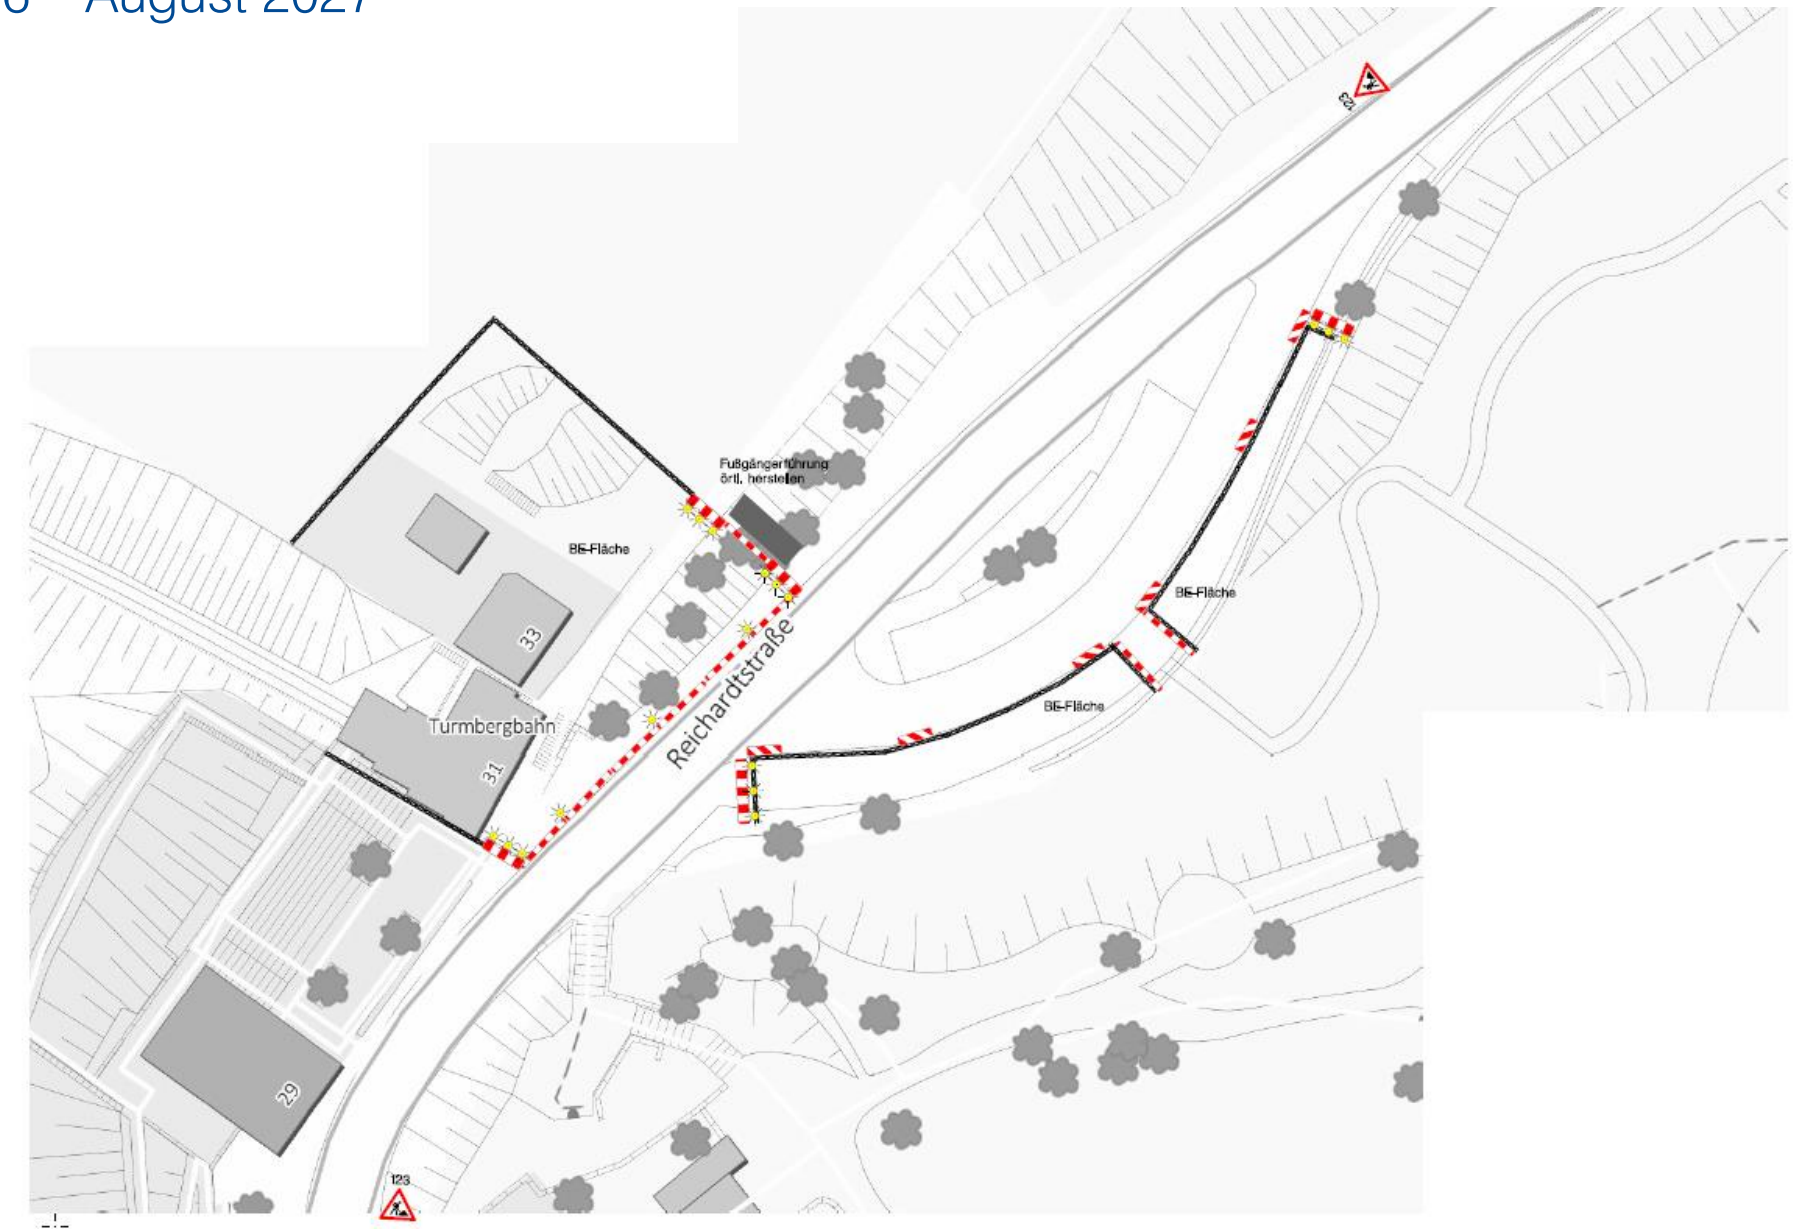

Baubegleitende Maßnahmen

- Werktägliche Arbeitszeit von 7:00 bis 18:00 Uhr, wobei lärmintensive Arbeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr
- Lärmschutzoptimierte Baustelleneinrichtungen
- Anwohnerinformation bei kurzfristigen und temporären Baumassnahmen
- Beschränkung der Umwelteinwirkungen durch Lärm, Staub und Erschütterungen auf ein unvermeidbares Mindestmaß
- Fachkundige ökologische Baubegleitung und Einsatz eines Immissionsschutzbeauftragten durch die VBK
- Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden am Gehölz und am Baumbestand
- Regelmäßige Kontrollen der Baustellensicherheit durch Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
- Laufende Abstimmungen mit den Fachdienststellen der Stadt Karlsruhe.
